

Proyecto Preprofesional

Ing. Daniel Pantoja



Objetivo de la sesión

Al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de levantar contexto real para adaptar WoW y planificar su estrategia de implementación de solución.





La ilusión de la 'talla única' y la prisión del método



Imponer marcos de trabajo prescriptivos (Scrum, SAFe) sin considerar el entorno crea fricción, rechazo y un comportamiento de cumplimiento superficial ('Agile de nombre'). Como advierte Cynefin: no se puede resolver un problema complejo aplicando una solución simple.


Contexto, stakeholders y restricciones (para tailoring)



Contenido de sesión:



01.




Contexto



Evolucionar hacia un locus de control interno

Prisión del Método (Imposición)	WoW Adaptado (Choose Your WoW!)
• Locus de control externo (dictado por la gerencia).	• Locus de control interno (autonomía del equipo).
• Falsa previsibilidad y rigidez metodológica.	• Optimización del flujo y mejora continua guiada (GCI).
• Ajustar la realidad para que quepa en el marco.	• Ajustar el marco para que resuelva la realidad.

El embudo contextual: de la filosofía a la acción

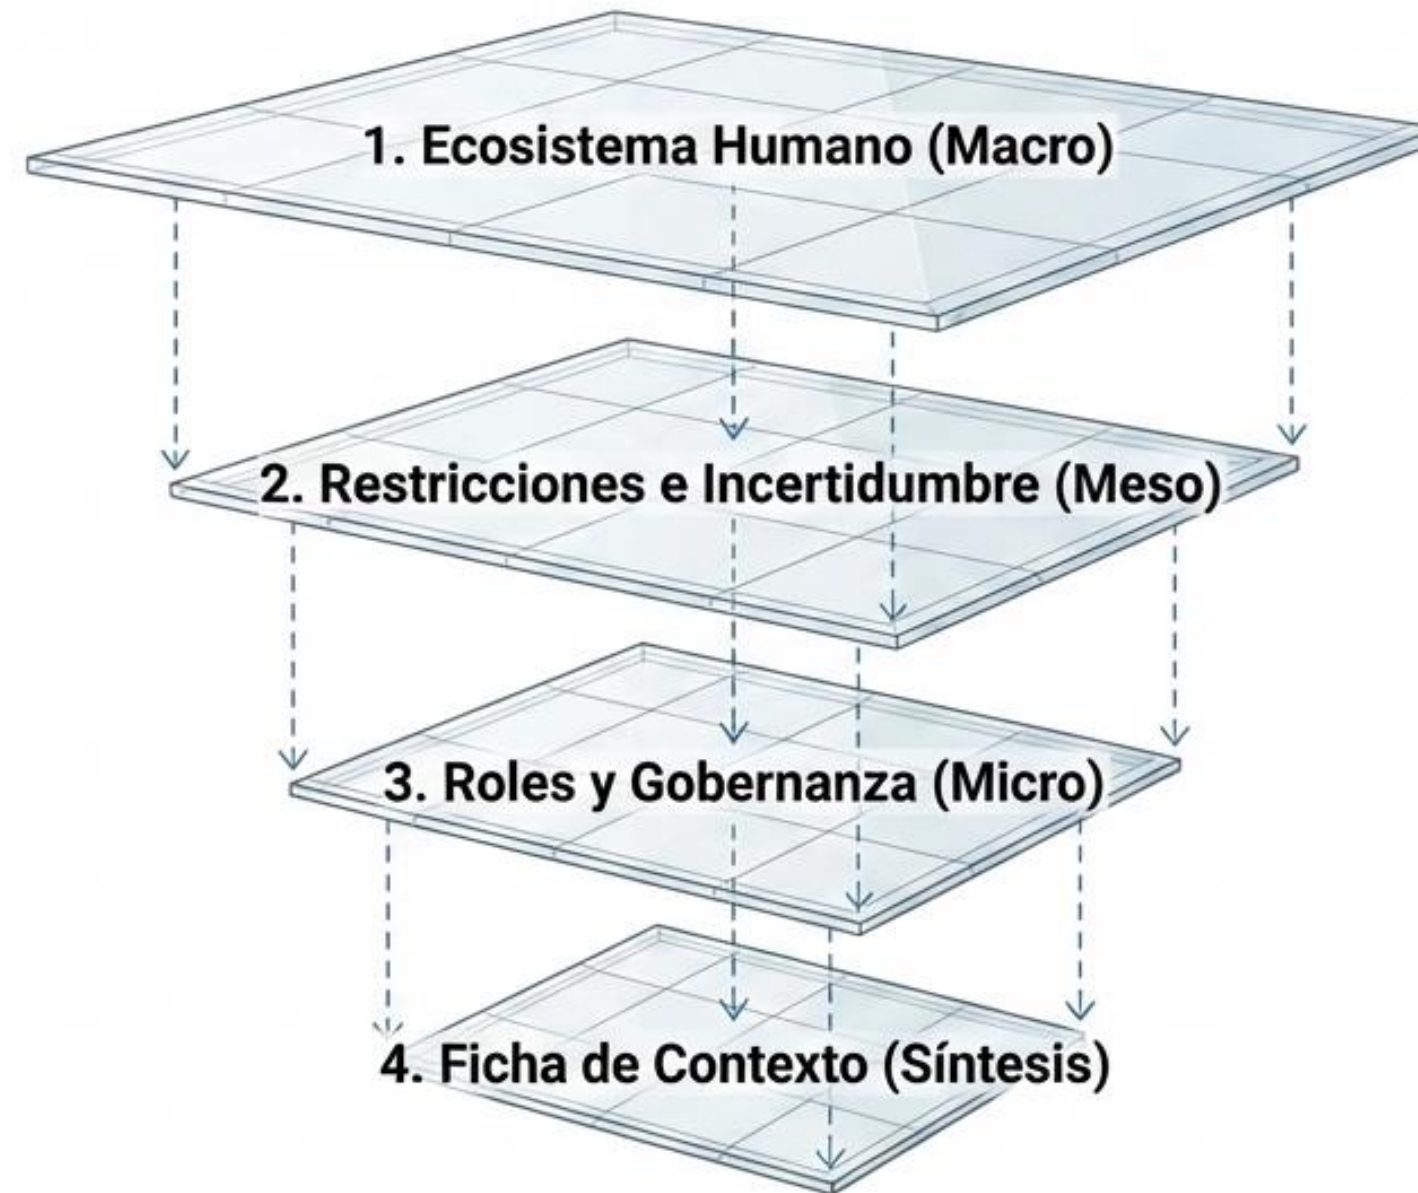

Nuestro objetivo hoy: construir una Ficha de Contexto real para su proyecto.

EL ENTREGABLE DE HOY · 3 min

Lo que te llevas al final de la clase

Una hoja con tres bloques. La llenamos por partes, una al cerrar cada sección.

1 QUIÉN

Tus tres stakeholders críticos: en qué cuadrante están, qué necesitan de ti y cada cuánto les hablas.

Parte 1 · al cerrar stakeholders

2 QUÉ PASA SI

Tu supuesto más peligroso: qué pasa si falla, cómo lo pruebas rápido y para cuándo.

Parte 2 · al cerrar restricciones


3 CÓMO

Quién decide: el Accountable con nombre propio, tus tres hitos y qué puedes decidir tú sin pedir permiso.

Parte 3 · al cerrar gobernanza

No es tarea para después: se llena aquí, en clase, sobre tu proyecto real.

02.




Stakeholders




Mapeando el ecosistema humano

Los proyectos no fracasan por falta de procesos, fracasan por desajustes humanos. Los “stakeholders” no son roles en un papel; son individuos con necesidades en competencia, niveles de influencia fluctuantes y expectativas dinámicas.

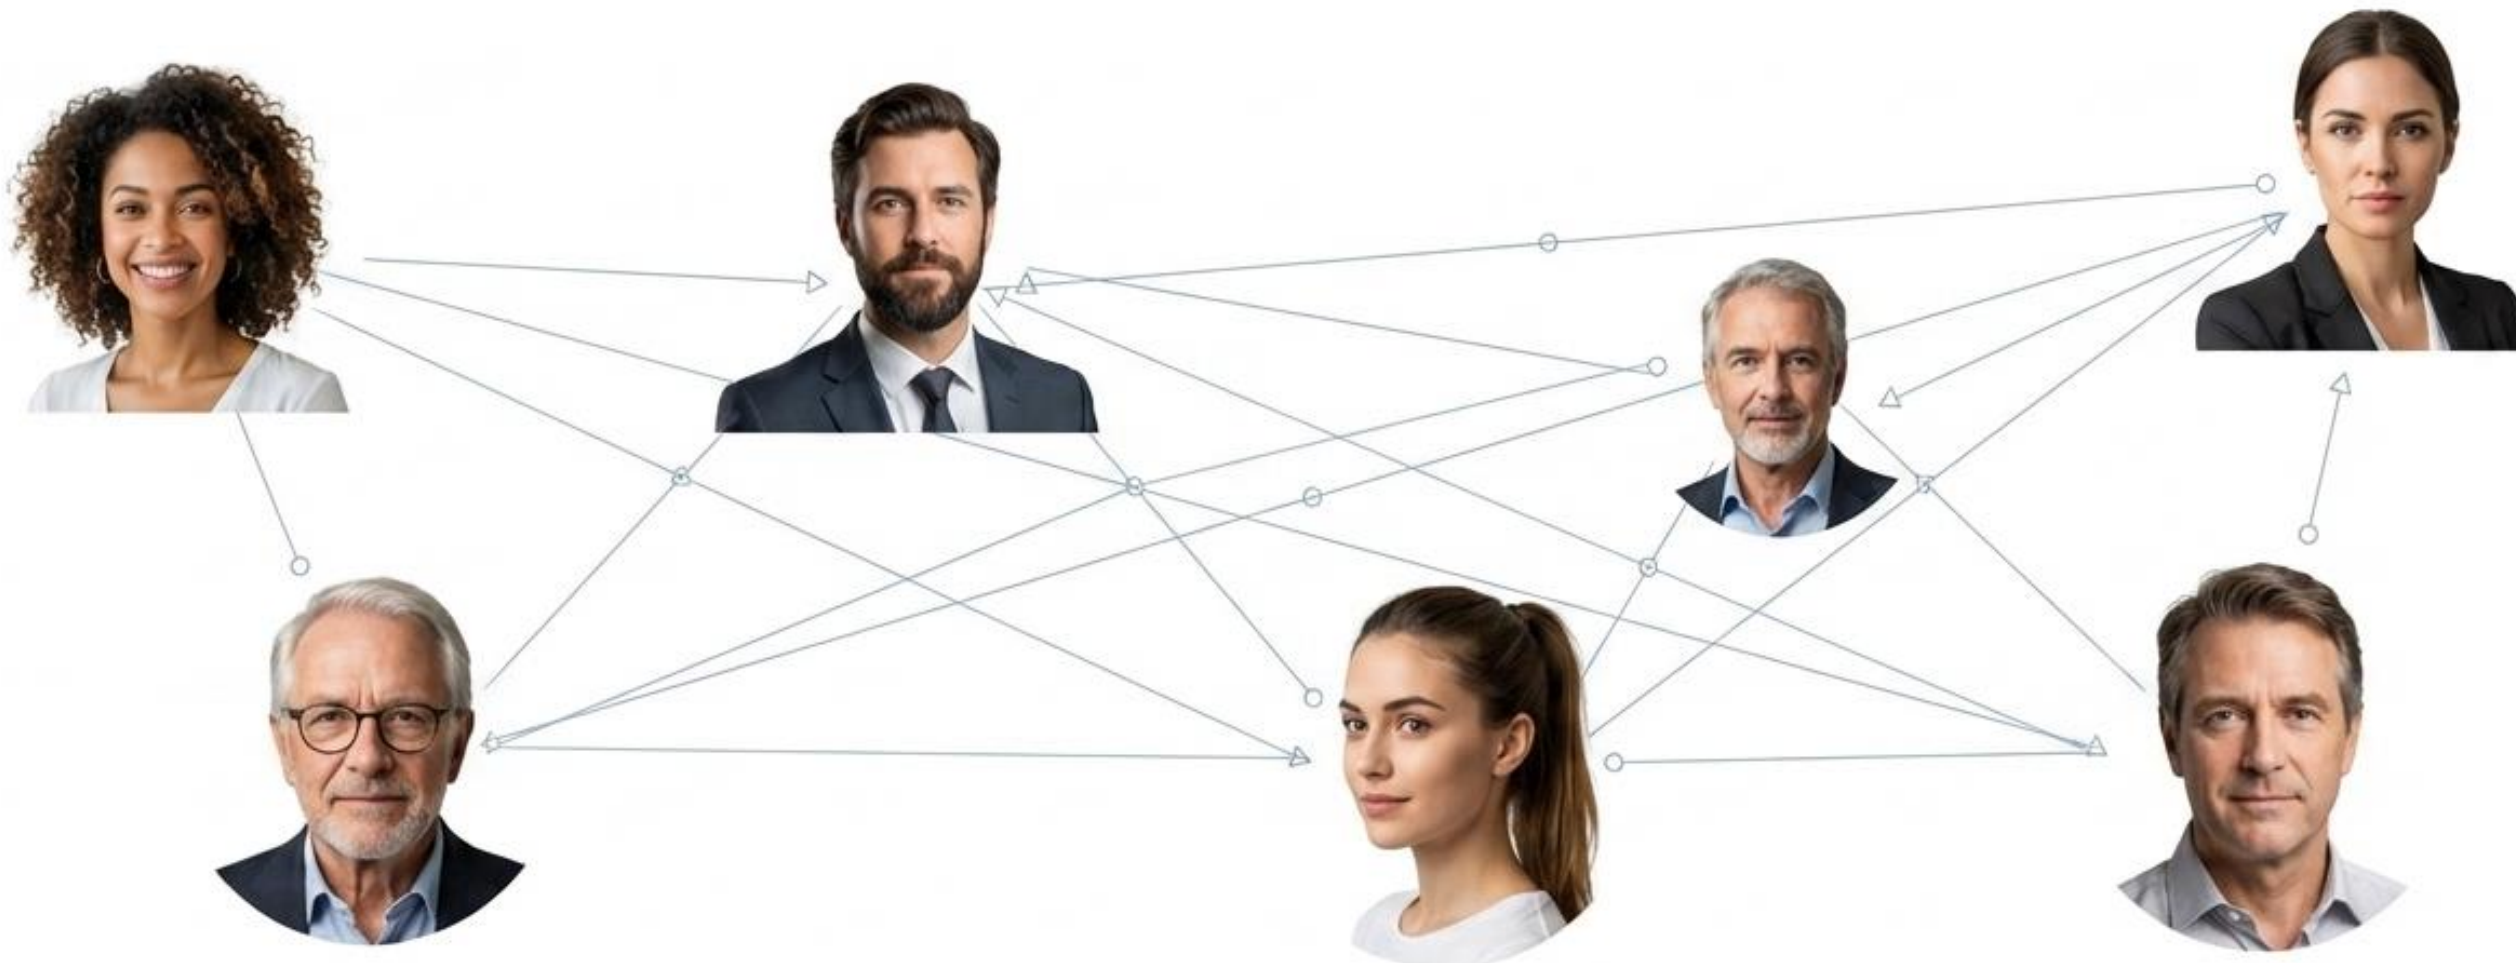


Las esferas de influencia del proyecto

Cada equipo opera dentro de capas de influencia. Identificar quién habita cada capa es el primer paso para adaptar nuestra comunicación y procesos.

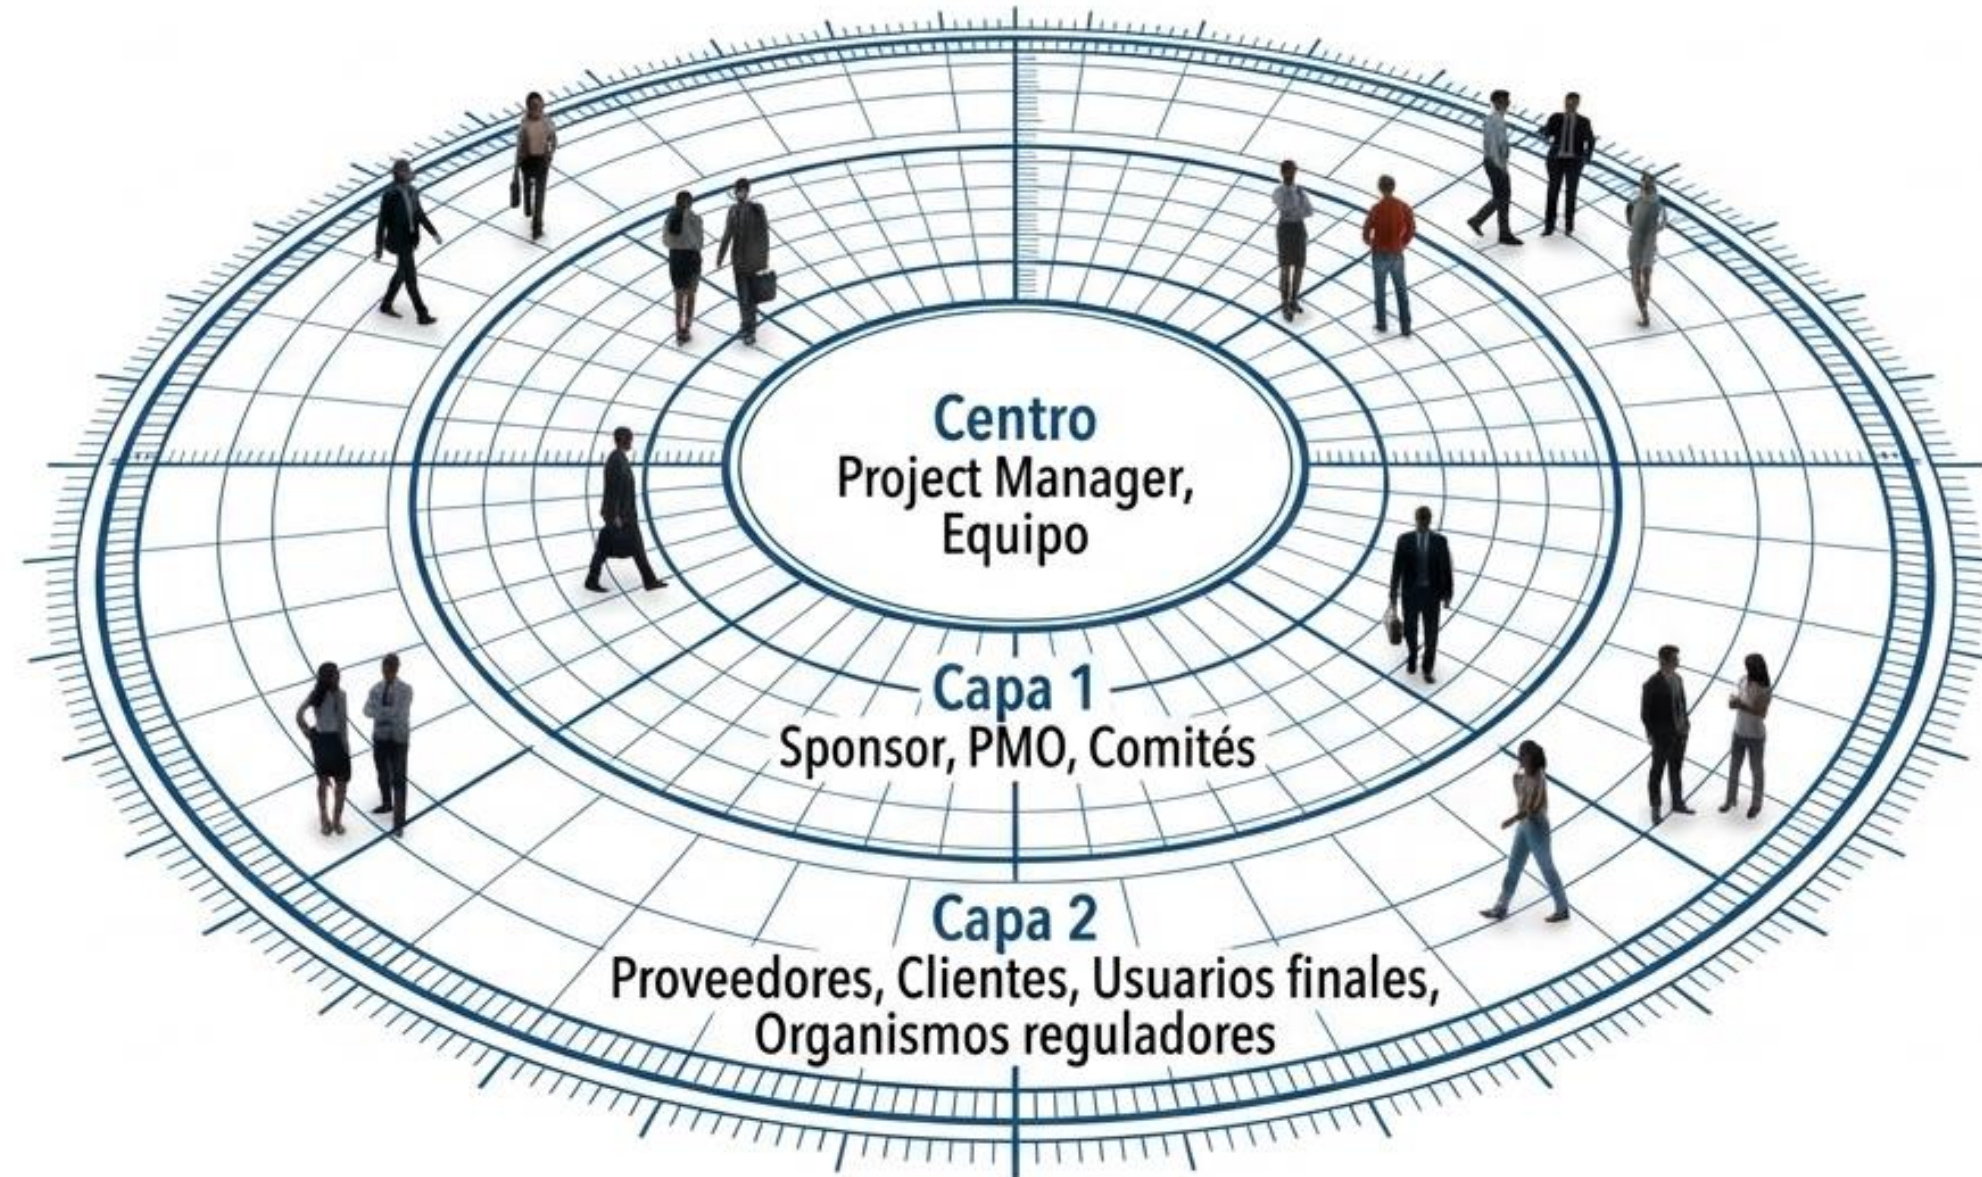

La matriz de Poder-Interés: no todos requieren la misma energía

El engagement se diseña. Clasificar a los interesados nos permite asignar recursos cognitivos y temporales donde más importan, evitando el desperdicio **lean** en la comunicación.

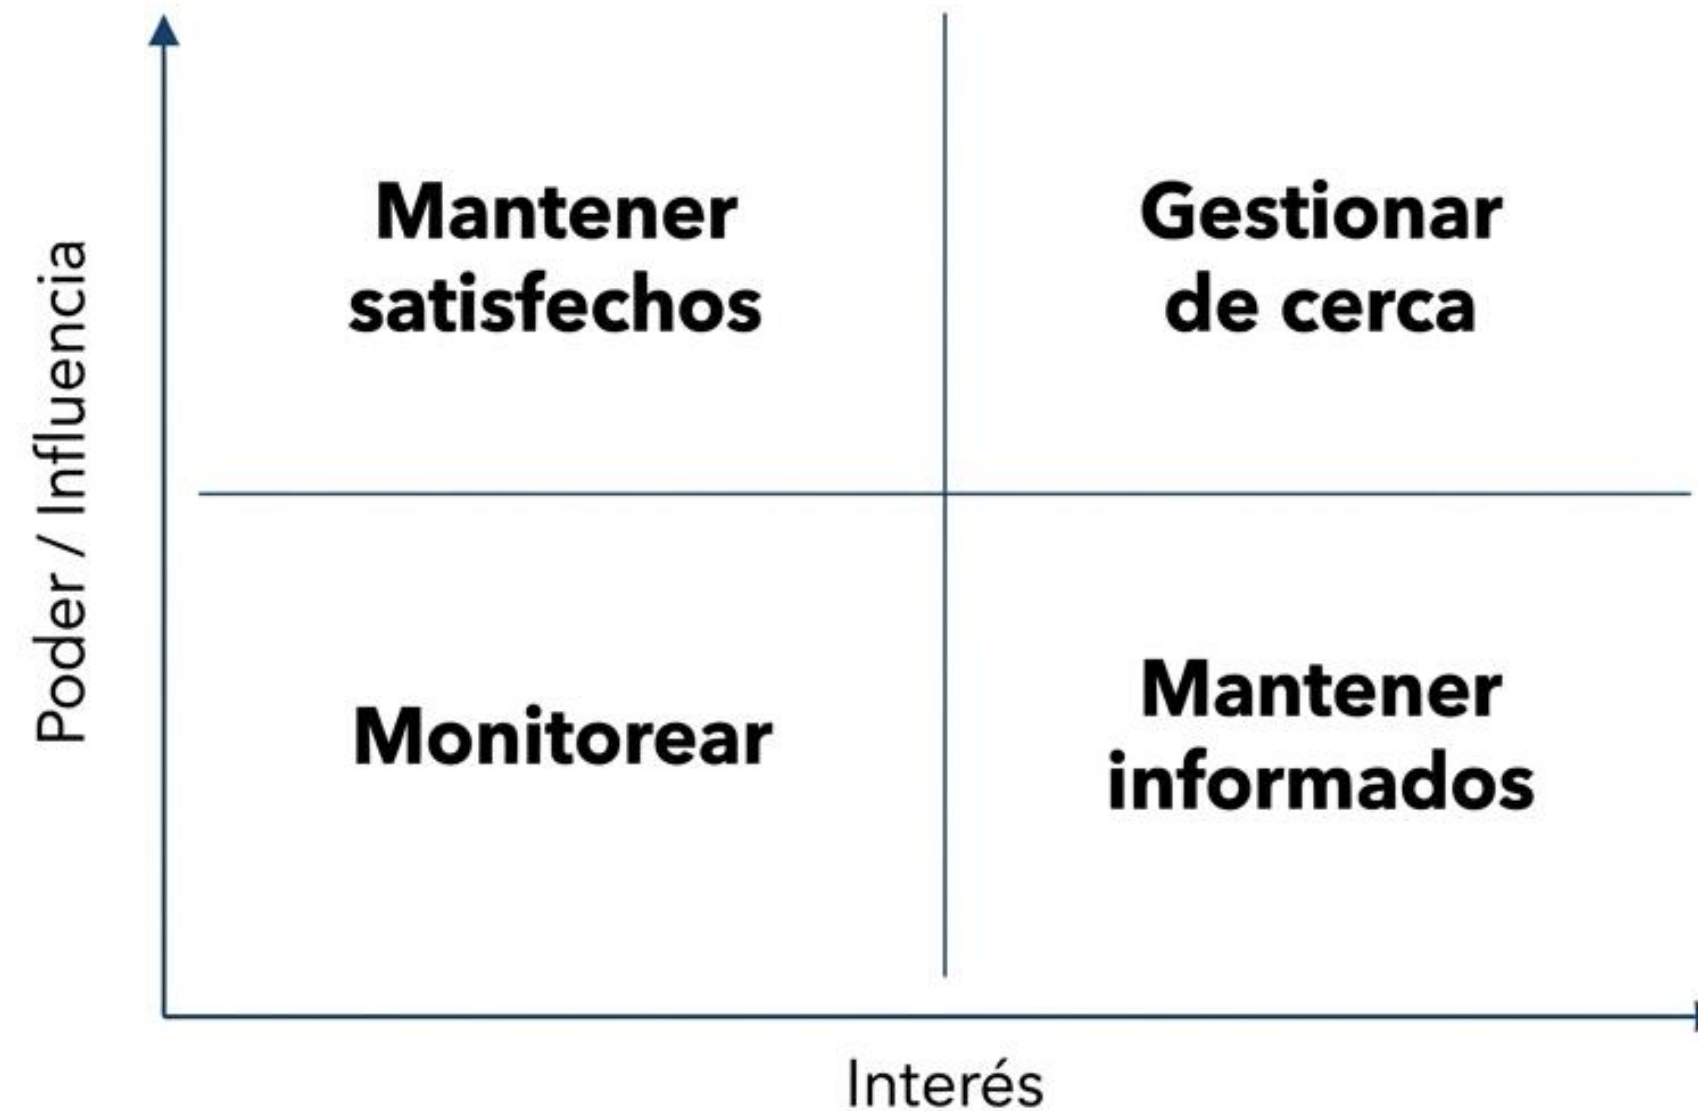

CASO 1 · 7 min

¿En qué cuadrante va cada uno?

Proyecto: digitalizar el almacén de una empresa mediana. Estos son los seis personajes.

1 El gerente general: firmó el presupuesto y pregunta una vez al mes.

3 El practicante de TI: hace la mitad del trabajo técnico y no decide nada.

5 El sindicato: sin autoridad sobre el proyecto, pero puede parar la planta.

2 El jefe de almacén: no firmó nada, pero si él dice que no, nada avanza.

4 El contador: solo quiere que el sistema exporte en su formato.

6 El proveedor del software: cobra por hora y responde cuando quiere.

Escriban en el chat solo los dos números que ustedes pondrían en «Gestionar de cerca».

Cómo lo hacemos: Cuento hasta cinco, leo cómo se repartió el chat y dos voluntarios sustentan al micro.

Estrategias dinámicas de comunicación

La matriz dicta el flujo de trabajo (WoW). Si tu sponsor está en 'Gestionar de cerca', un reporte mensual automatizado será una señal de mal ajuste. Requiere interacciones iterativas y demostraciones de valor.



Señales de mal ajuste en la gestión de stakeholders

Síntoma Observado	Causa Raíz Probable
 Silencio en las revisiones	Falta de seguridad psicológica o desinterés (Bajo engagement).
 Cambios constantes de alcance	Necesidades no descubiertas o falta de visión compartida.
 Aprobaciones estancadas	El verdadero tomador de decisiones no fue mapeado (Poder oculto).

TU FICHA · PARTE 1 DE 3 · 8 min

QUIÉN

QUÉ PASA SI

CÓMO

Tus tres stakeholders críticos

Nombre y rol

Cuadrante

Qué necesita de ti


Cada cuánto le hablas

¿Hay alguien con poder real que no aparece en ningún organigrama? Ese es el que te falta en la lista.

Cómo lo hacemos: Escriban en el chat solo ese: el que casi se les olvidó. Dos voluntarios abren micro y cuentan por qué.



03.



Restricciones




Los límites invisibles del sistema

Más allá de las personas, el entorno físico, regulatorio y técnico dicta qué prácticas ágiles o predictivas son viables. Ignorar las restricciones es la vía más rápida para 'encallar' el proyecto.




El ecualizador contextual: definiendo las variables

Diferentes proyectos requieren diferentes configuraciones. Un equipo distribuido con alta regulación no puede operar igual que un equipo local creando un prototipo.

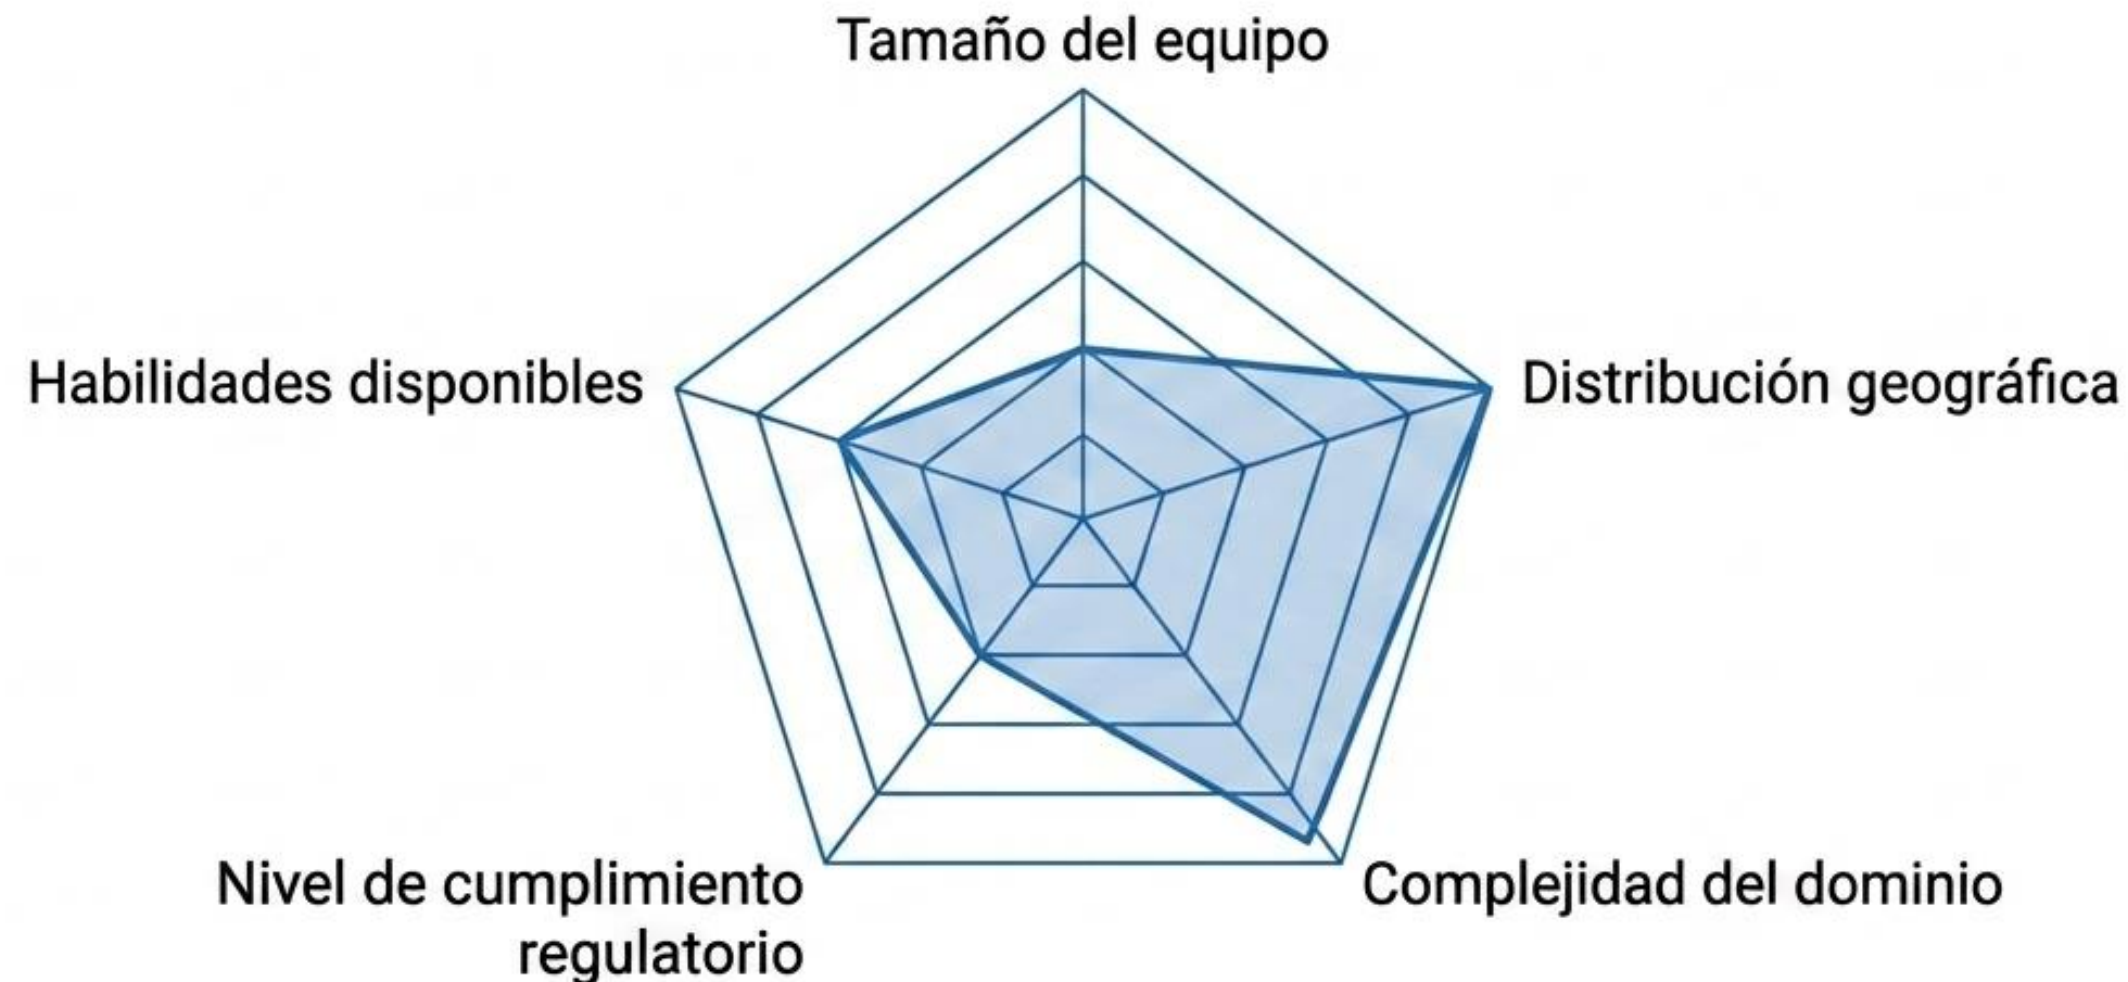


La materia oscura del proyecto: Incertidumbre y Supuestos

Lo que sabemos es solo una fracción de la realidad. Los supuestos no validados actúan como restricciones ocultas que pueden desestabilizar todo el WoW elegido.

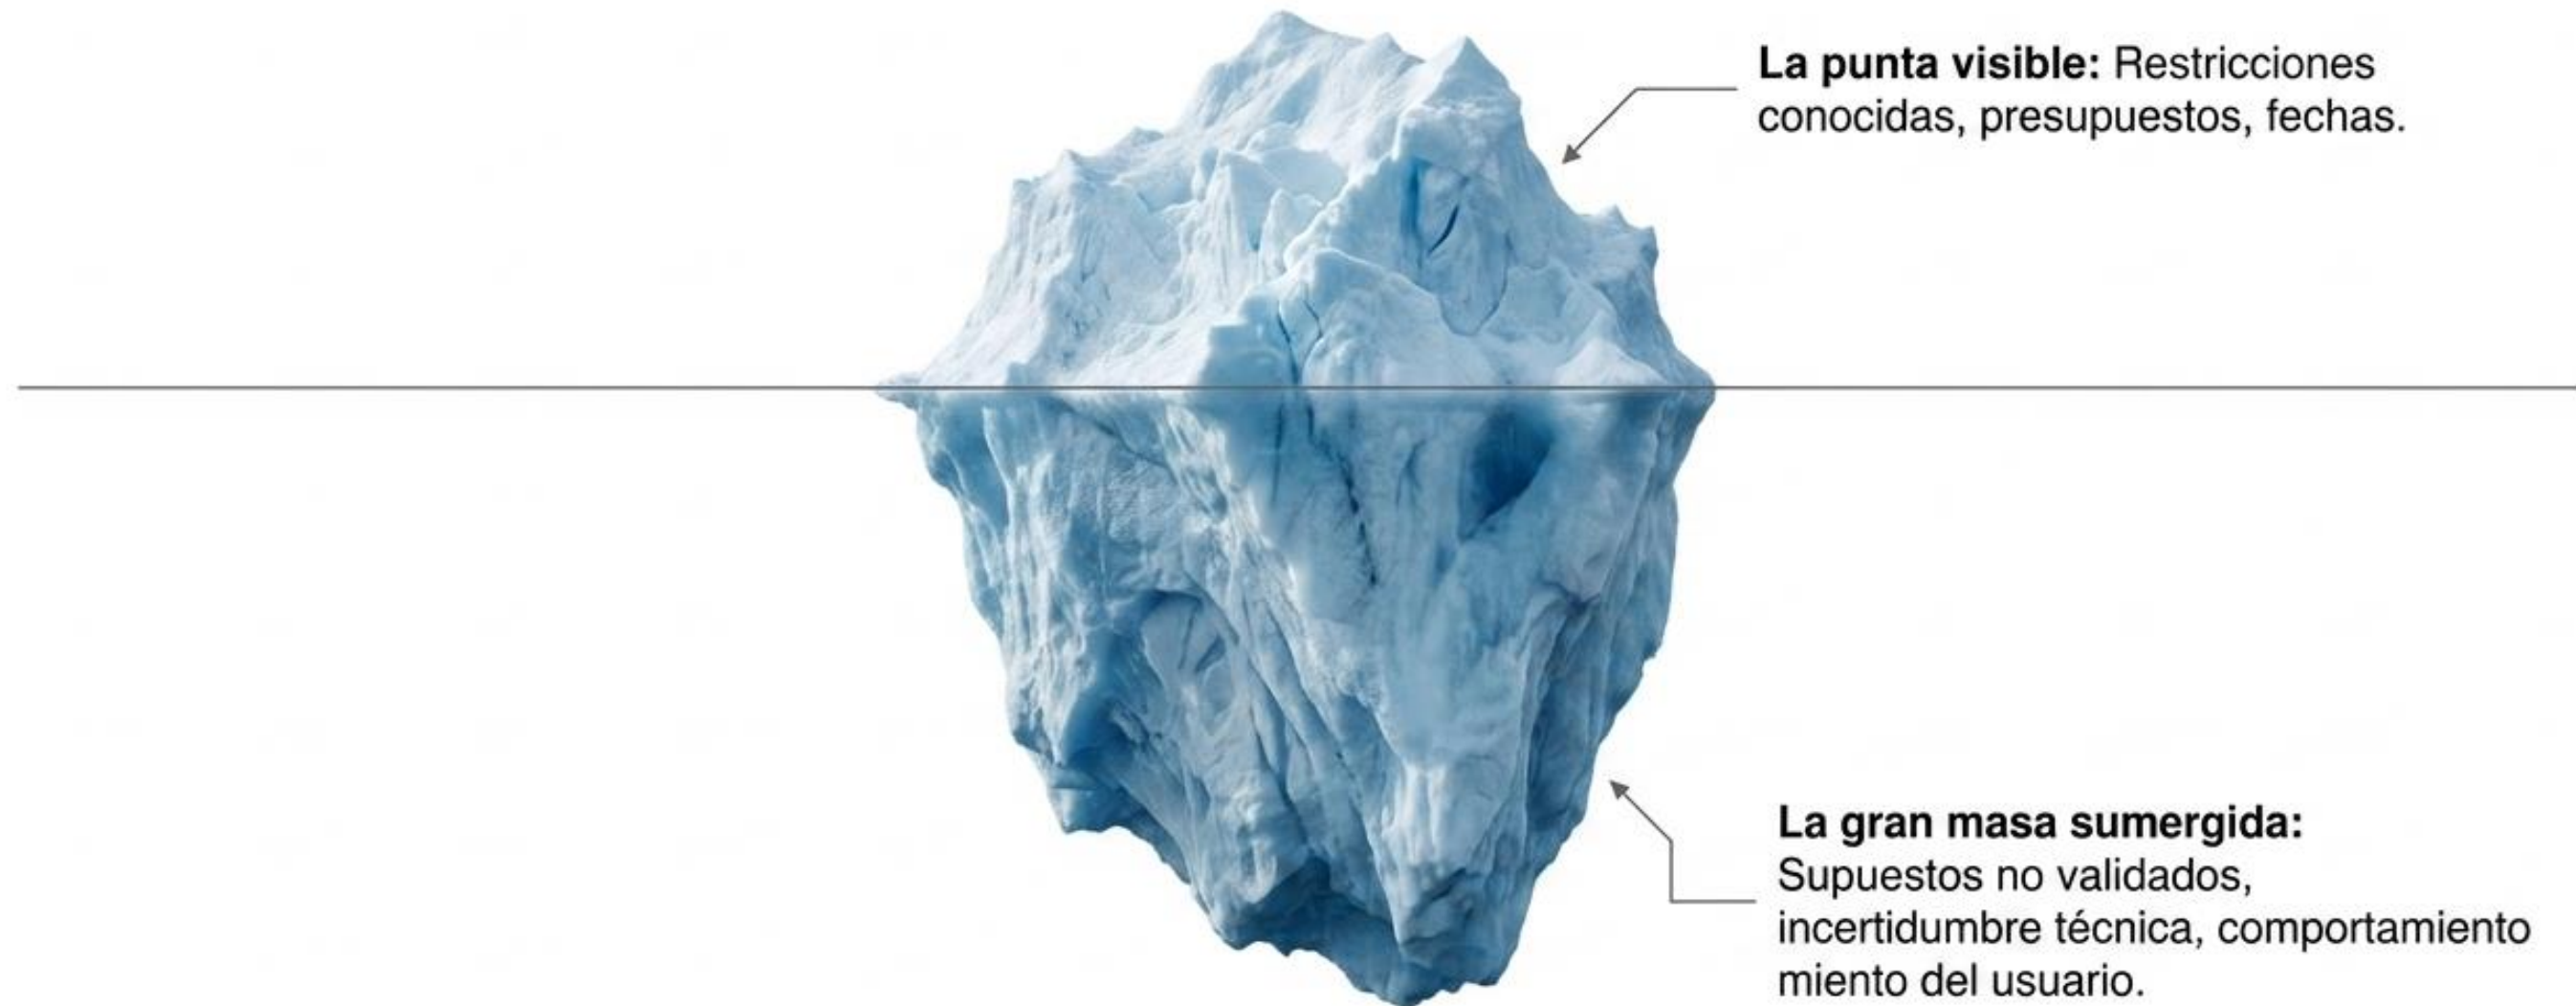

El Registro de Supuestos: documentando lo invisible

Un supuesto es un factor que consideramos verdadero sin evidencia. El registro de supuestos captura, rastrea y valida estos factores de riesgo antes de que se conviertan en incidentes críticos.

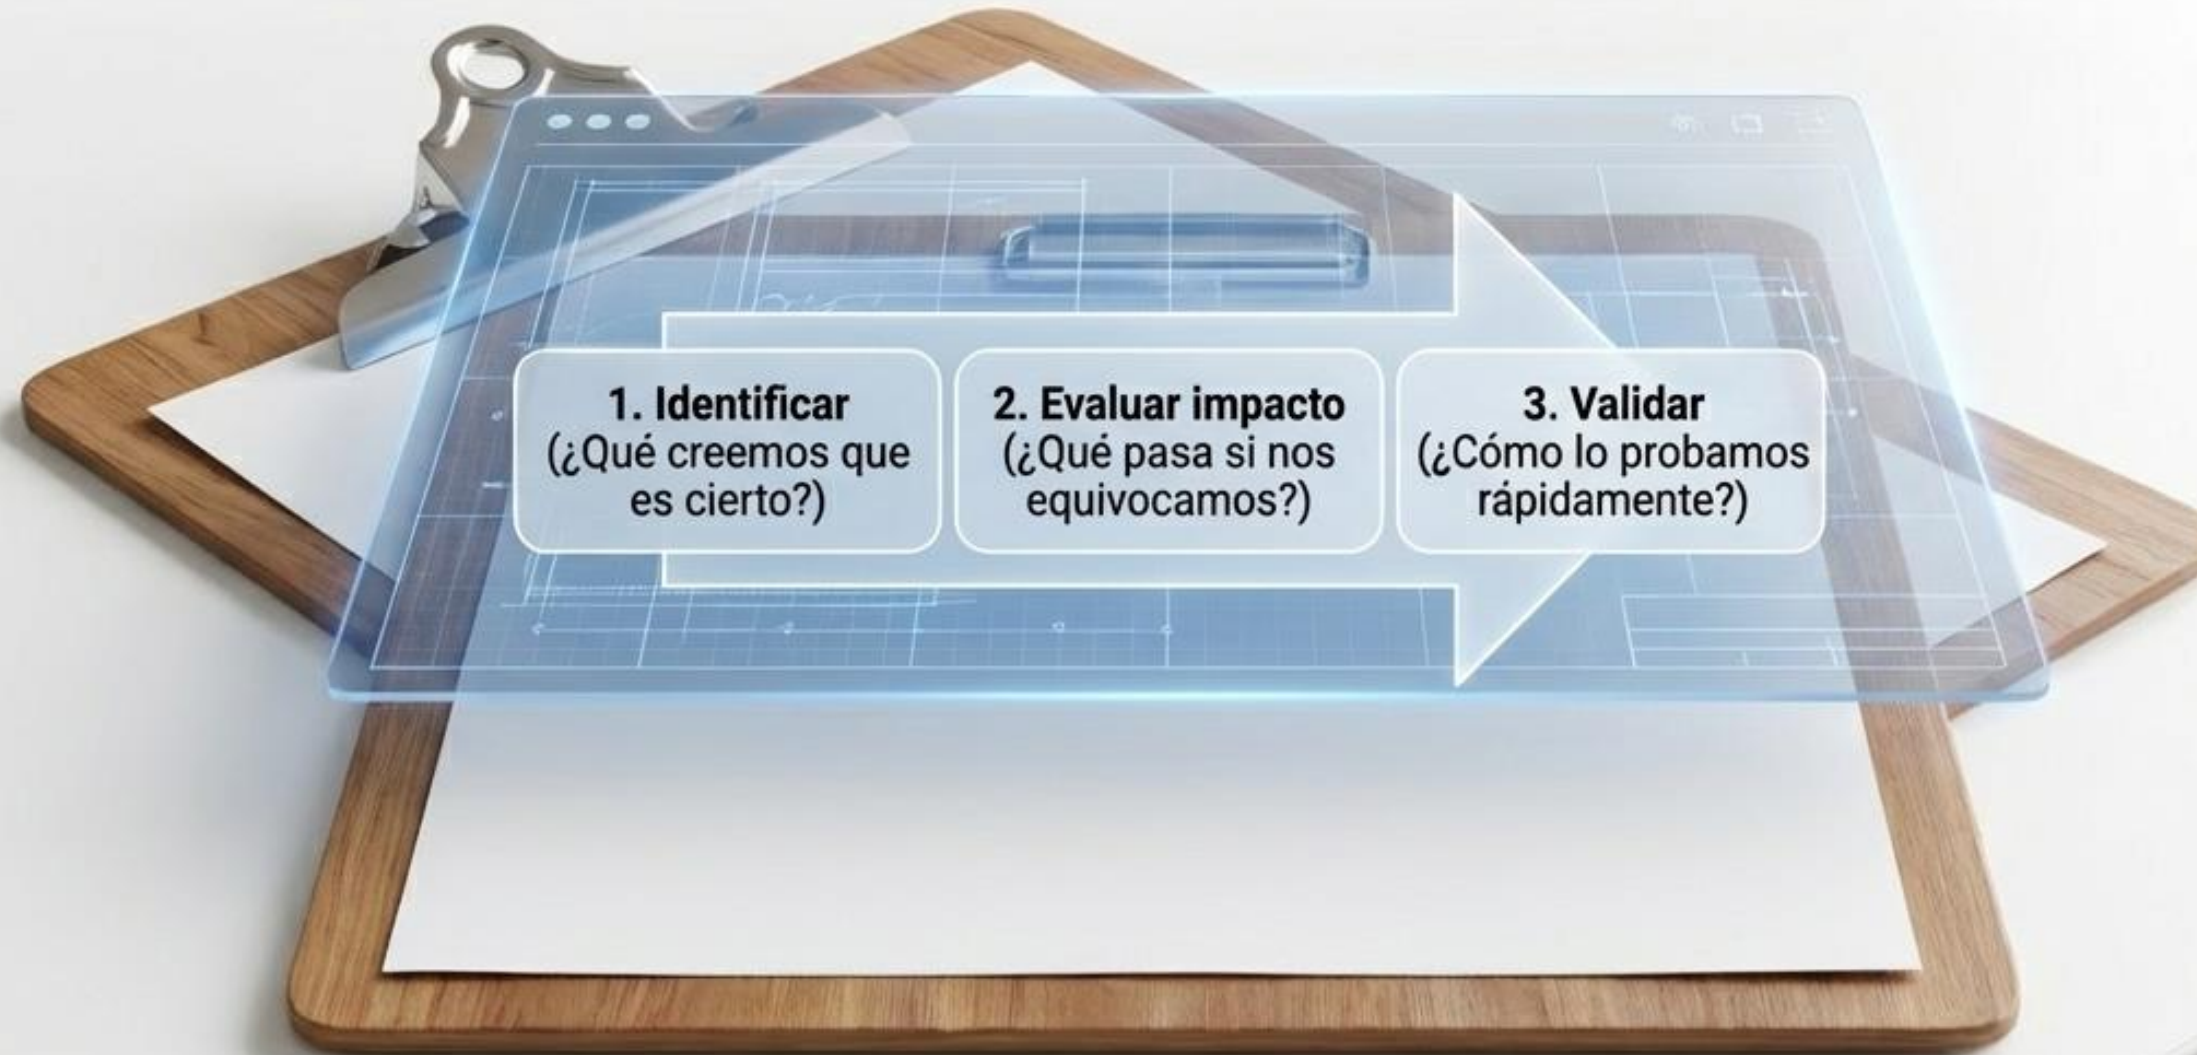

VOTACIÓN RÁPIDA · 5 min

¿Restricción, supuesto o incertidumbre?

Escriban R, S o I en el chat en cada frase. Van seis, una por vez.

1 El presupuesto es de S/ 60 000, aprobado y cerrado.

2 Creemos que el jefe de almacén va a querer usar el sistema.

3 No sabemos cuántos SKU distintos maneja el almacén hoy.

4 La auditoría interna revisa el proyecto en noviembre.

5 Asumimos que el proveedor tiene su API documentada.

6 No tenemos idea de cuánto tarda hoy un inventario completo.

La diferencia es práctica: la restricción se planifica, el supuesto se valida y la incertidumbre se investiga.

Señales de mal ajuste en el entorno y restricciones

Síntoma Observado	Causa Raíz Probable
 Deuda técnica disparada	 Complejidad de la solución subestimada (Supuestos técnicos fallidos).
 Retrasos por auditoría	 Requisitos de cumplimiento ignorados en el diseño del WoW.
 Caída de productividad	 Desfase entre el ciclo de vida elegido y la distribución geográfica del equipo.

TU FICHA · PARTE 2 DE 3 · 8 min

QUIÉN

QUÉ PASA SI

CÓMO

Tu supuesto más peligroso

Supuesto

Si falla, ¿qué pasa?

¿Cómo lo pruebo rápido?

¿Cuándo?

Si el supuesto se cae, ¿cambia tu plan o cambia tu proyecto? Ahí está la diferencia entre un riesgo y un problema.

Cómo lo hacemos: Escriban en el chat el supuesto y cómo lo prueban, en una línea. Leo tres y les busco una prueba más barata.



El embotellamiento de la rendición de cuentas

Cuando todos son responsables, nadie rinde cuentas. La falta de claridad en los derechos de decisión genera bloqueos, duplicación de trabajo y desgaste del equipo.



La Matriz RACI: dirigiendo el flujo de trabajo

Una herramienta fundamental para asegurar la rendición de cuentas y limpiar los canales de comunicación dentro del WoW.

Activity	Ann	Ben	Carlos	Dina	Ed
Create charter	A	R	I	I	I
Collect requirements	I	A	R	C	C
Submit change request	I	A	R	R	C
Develop test plan	A	C	I	I	R

- **R (Responsible):** Quien ejecuta el trabajo.

- **A (Accountable):** Quien aprueba y rinde cuentas (Solo uno por tarea).

- **C (Consulted):** Quien aporta información (Comunicación bidireccional).

- **I (Informed):** Quien necesita saber el resultado (Unidireccional).

PRÁCTICA · 8 min

Arregla este RACI


Mismo proyecto del almacén. Esta matriz tiene varios errores clásicos.

	Ana	Beto	Carla	Diego
1 Definir el alcance del sistema	A	A	R	I
2 Levantar requisitos del almacén	R	C	C	C
3 Aprobar el diseño técnico	C	C	C	C
4 Cargar los datos maestros	R	I	I	I

Escriban en el chat el número de la fila con el error más grave, y por qué. Hay más de una respuesta defendible.

Gobernanza ligera: Hitos sobre procesos

Una gobernanza efectiva no fuerza a todos los equipos a usar el mismo proceso. Fuerza a que compartan una comprensión común del riesgo y la transparencia, utilizando hitos consistentes.

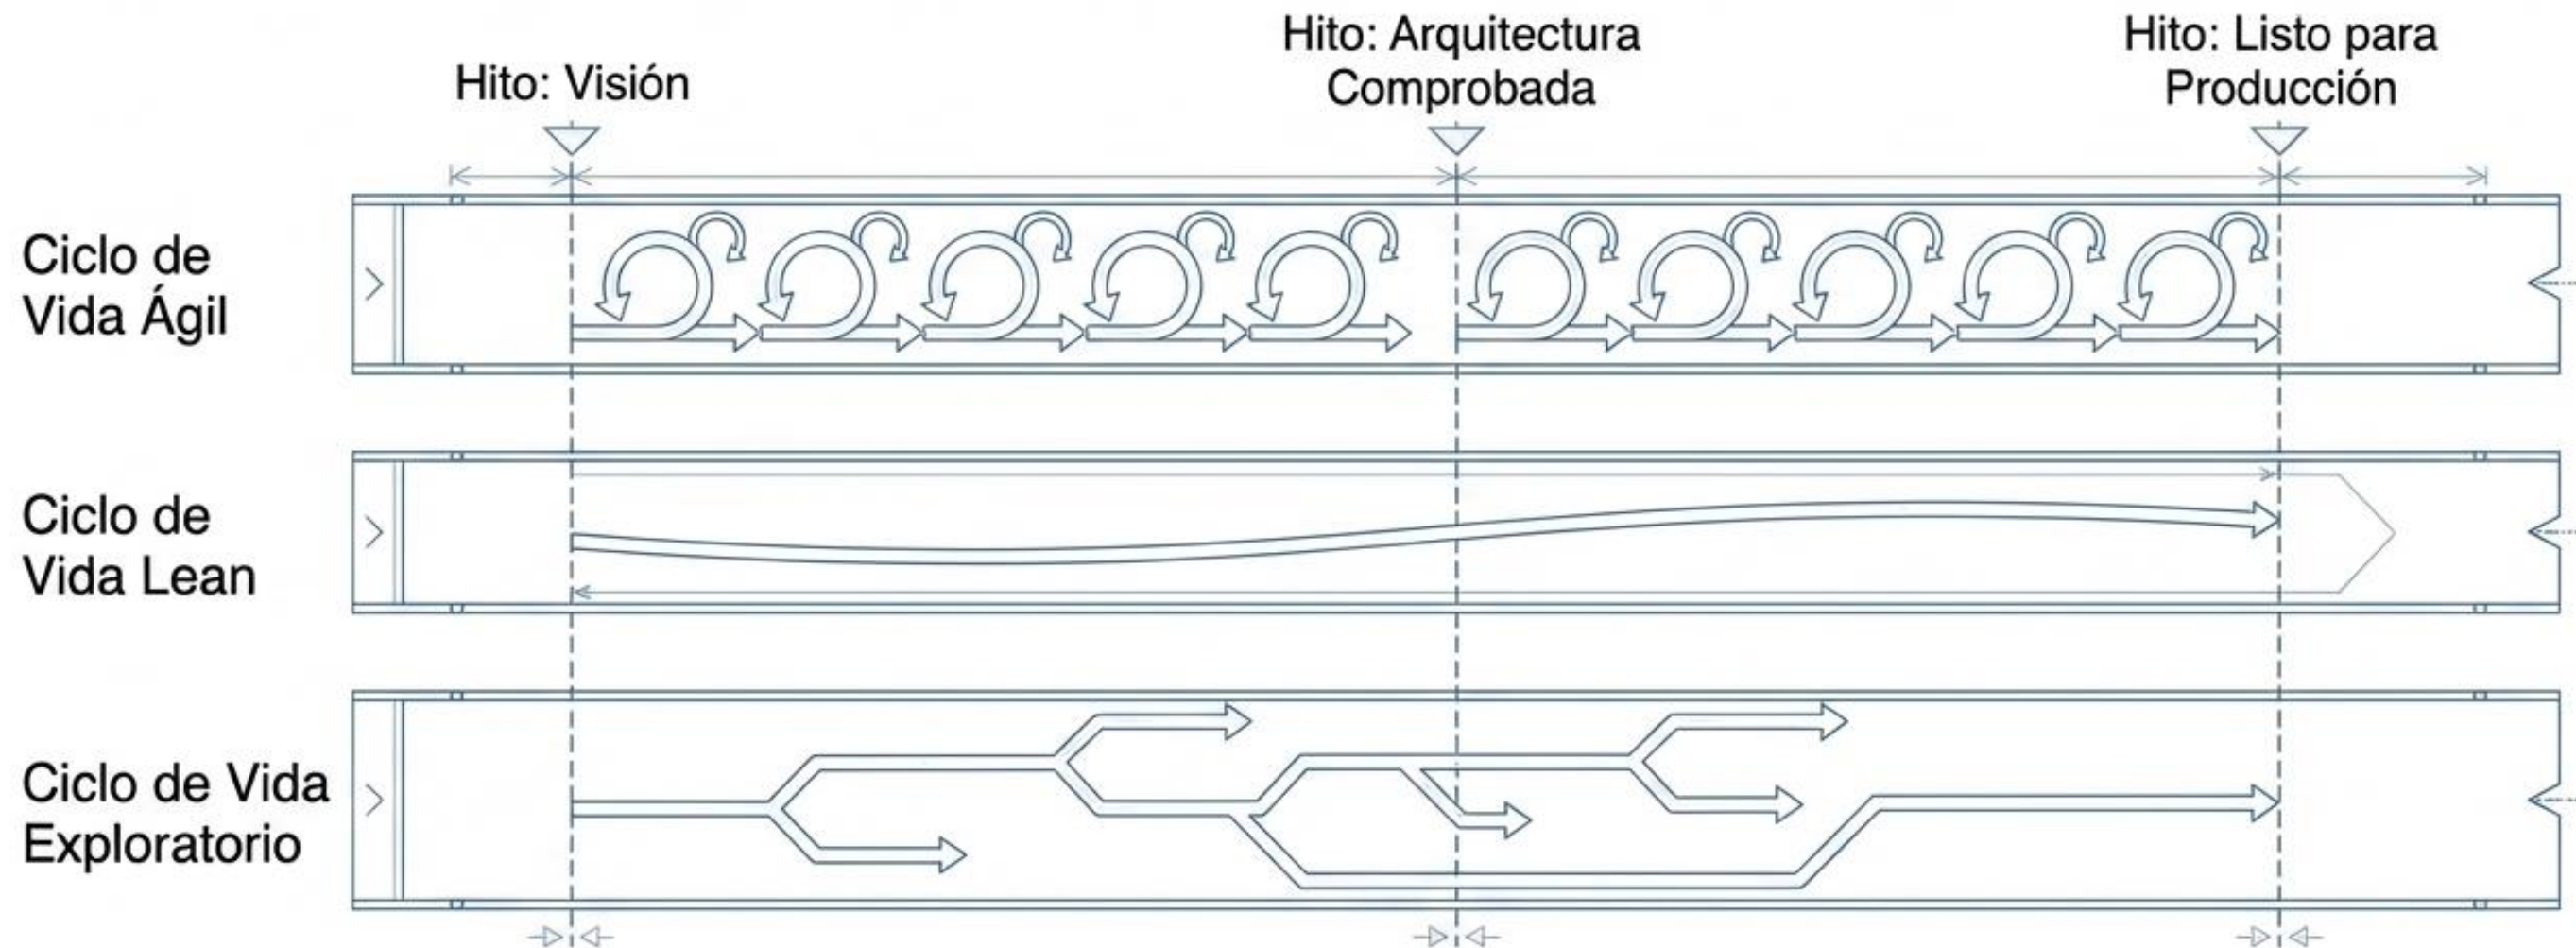

TU FICHA · PARTE 3 DE 3 · 7 min

QUIÉN

QUÉ PASA SI

CÓMO

Quién decide en tu proyecto

El Accountable

¿Quién responde por el resultado de tu proyecto? Un nombre propio, no un área ni «el equipo».

Tus tres hitos

¿Cuáles son, y qué se decide en cada uno? Un hito donde no se decide nada es una fecha decorativa.

Tu margen

¿Qué decisión puedes tomar tú sin pedir permiso a nadie? Si la respuesta es «ninguna», eso también es un hallazgo.

Si en la primera escribiste dos nombres o «el equipo», ahí está tu primer bloqueo, y ya lo encontraste.

Cómo lo hacemos: Escriban en el chat el nombre del Accountable. Si no lo saben, escriban «no lo sé»: también cuenta.



Estas herramientas no son tareas administrativas aisladas. Son **lentes interconectados** de una misma cámara para leer tu proyecto.





UTECH
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA
Y TECNOLOGÍA



MATERIAL DEL DOCENTE · NO PROYECTAR

Casos de reserva

Para cuando la clase avanza rápido, o cuando el debate se apaga y hay que reactivarlo.

El Scrum de la constructora

Una constructora impuso Scrum a su área de obra: dailies a las 7 a. m., sprints de dos semanas y retrospectivas. A los tres meses el equipo hacía las ceremonias y planificaba en un Excel aparte.

¿Qué del contexto se ignoró?

Conecta con: prisión del método, ecualizador contextual.

El sponsor que nunca apareció

Un proyecto tuvo un sponsor nombrado en el acta que no asistió a ninguna reunión. Las decisiones las tomaba de hecho el jefe de operaciones, sin autoridad formal.

¿A quién mapeas y con qué estrategia?

Conecta con: poder formal frente a poder real, RACI.

Los cinco accountables

Un equipo entregó un RACI donde cada actividad tenía tres o cuatro «A», «para que todos se sientan dueños».

¿Qué va a pasar en la primera decisión difícil?

Conecta con: embotellamiento de la rendición de cuentas.
