

Proyecto Preprofesional

Ing. Daniel Pantoja



Planificación Ligera de Proyectos

El puente entre la idea y la ejecución exitosa.

Iniciar un proyecto sin claridad sobre entregables, tiempos, riesgos y cambios es la fórmula más segura para el fracaso. La planificación no es burocracia; es la estrategia fundamental para ordenar el trabajo, anticipar problemas y garantizar resultados antes de invertir recursos y esfuerzo.

(Project Management Institute, 2024; Ambler & Lines, 2022)





¿Qué puede ocurrir en un proyecto si el equipo empieza a trabajar sin definir entregables, cronograma, riesgos y reglas para gestionar cambios?



Caos Operativo:

Esfuerzos duplicados y desperdicio de recursos.



Retrasos:

Incumplimiento de fechas críticas e hitos.



Fricción:

Conflictos en el equipo por falta de claridad y responsabilidades cruzadas.




Fracaso:

Pérdida de valor y desviación del objetivo estratégico original.

Objetivo de sesión

Al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de **construir el Plan Base del proyecto listo para iterar**, definiendo y organizando **backlog/entregables**, una **WBS ligera**, **cronograma macro**, **riesgos base**, **plan de medición** y **mecanismo de control de cambios**, utilizando **WBS (Excel/MS Project)**, **cronograma (Gantt/Project)**, **matriz de riesgos**, **tablero de seguimiento** y **log de cambios**.

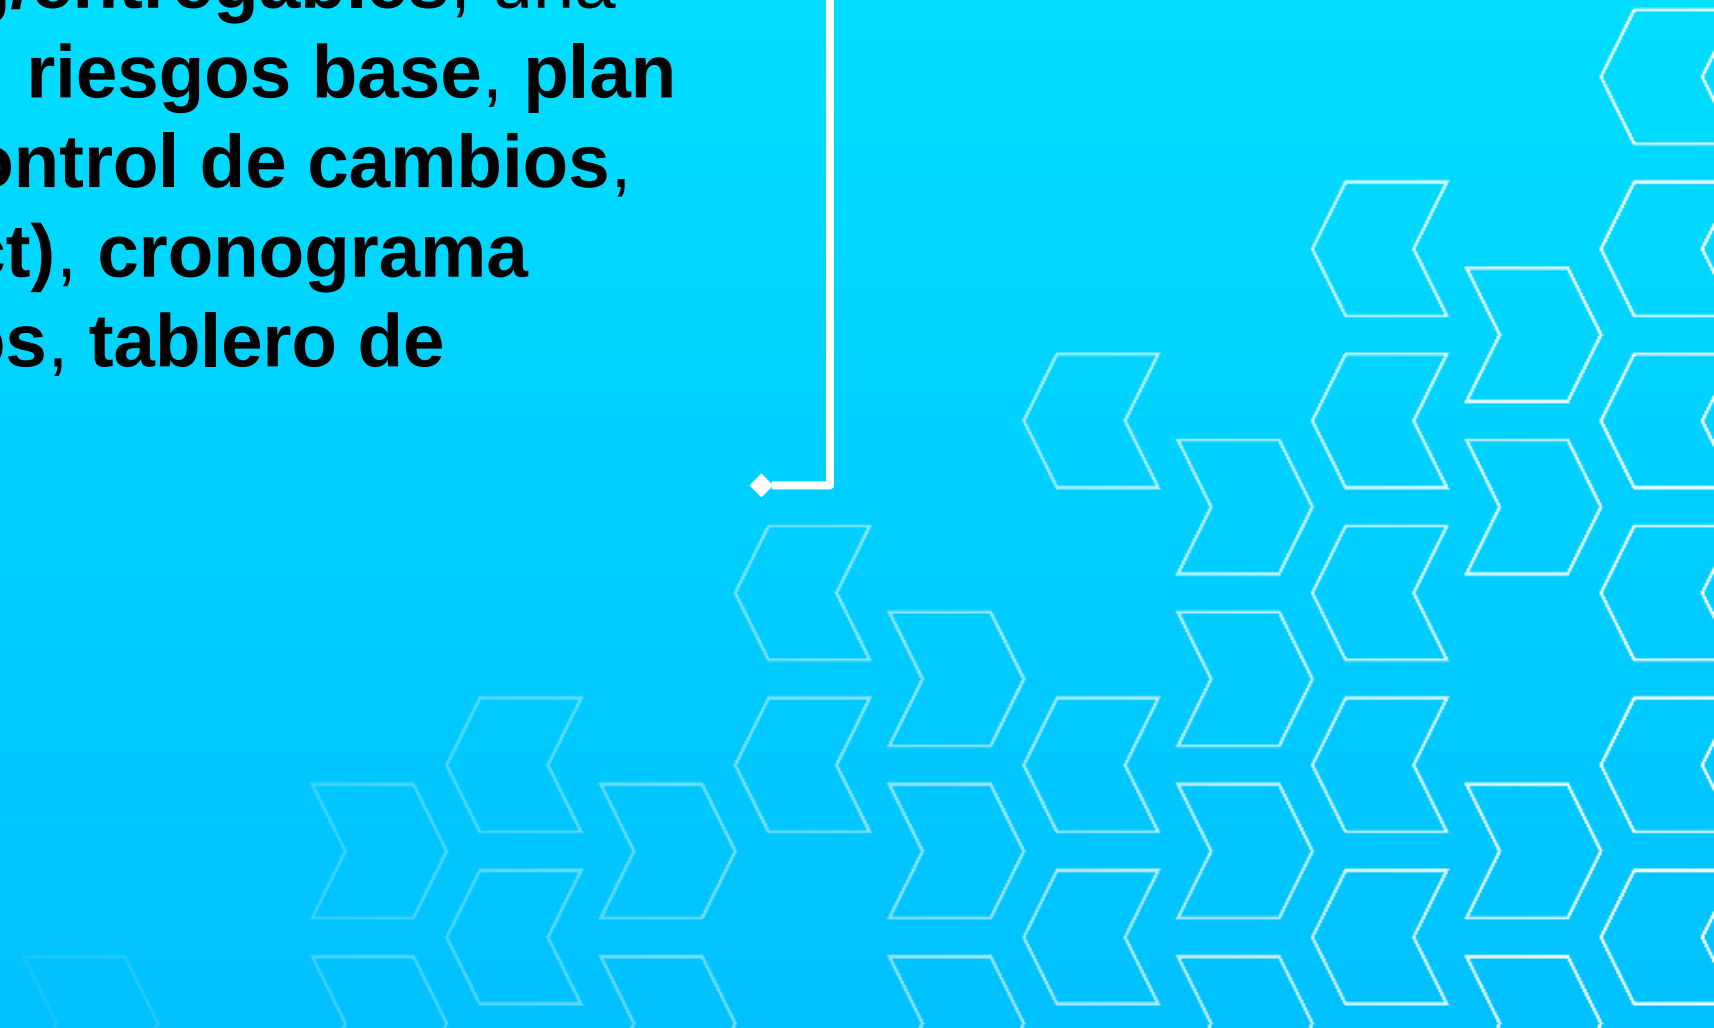

Cómo participamos hoy

Doscientos en línea. Cuatro reglas para que entren todos, y no siempre los mismos cinco.

1 Respuesta en el chat

Lanzo una pregunta y todos escriben una línea. Escriban pero no envíen: cuando diga «ahora», entra todo junto.

2 Votación por letra

Solo la letra o el número en el chat. Miro cómo se reparte y les digo en voz alta qué salió y por qué.


3 Micrófono abierto

Levantán la mano con el botón. Los llamo por nombre, abren micro y tienen noventa segundos.

4 Parada de dudas

Dejan la duda en el chat con el formato acordado. Las agrupo y las respondo en bloque.

UNIDAD 5 .



Plan Base listo para iterar
(baseline) + set de control



Contenido

01.

Backlog y
entregables

02.

WBS ligera

03.


Cronograma
macro

04.

Riesgos base

05.

Medición y
cambios

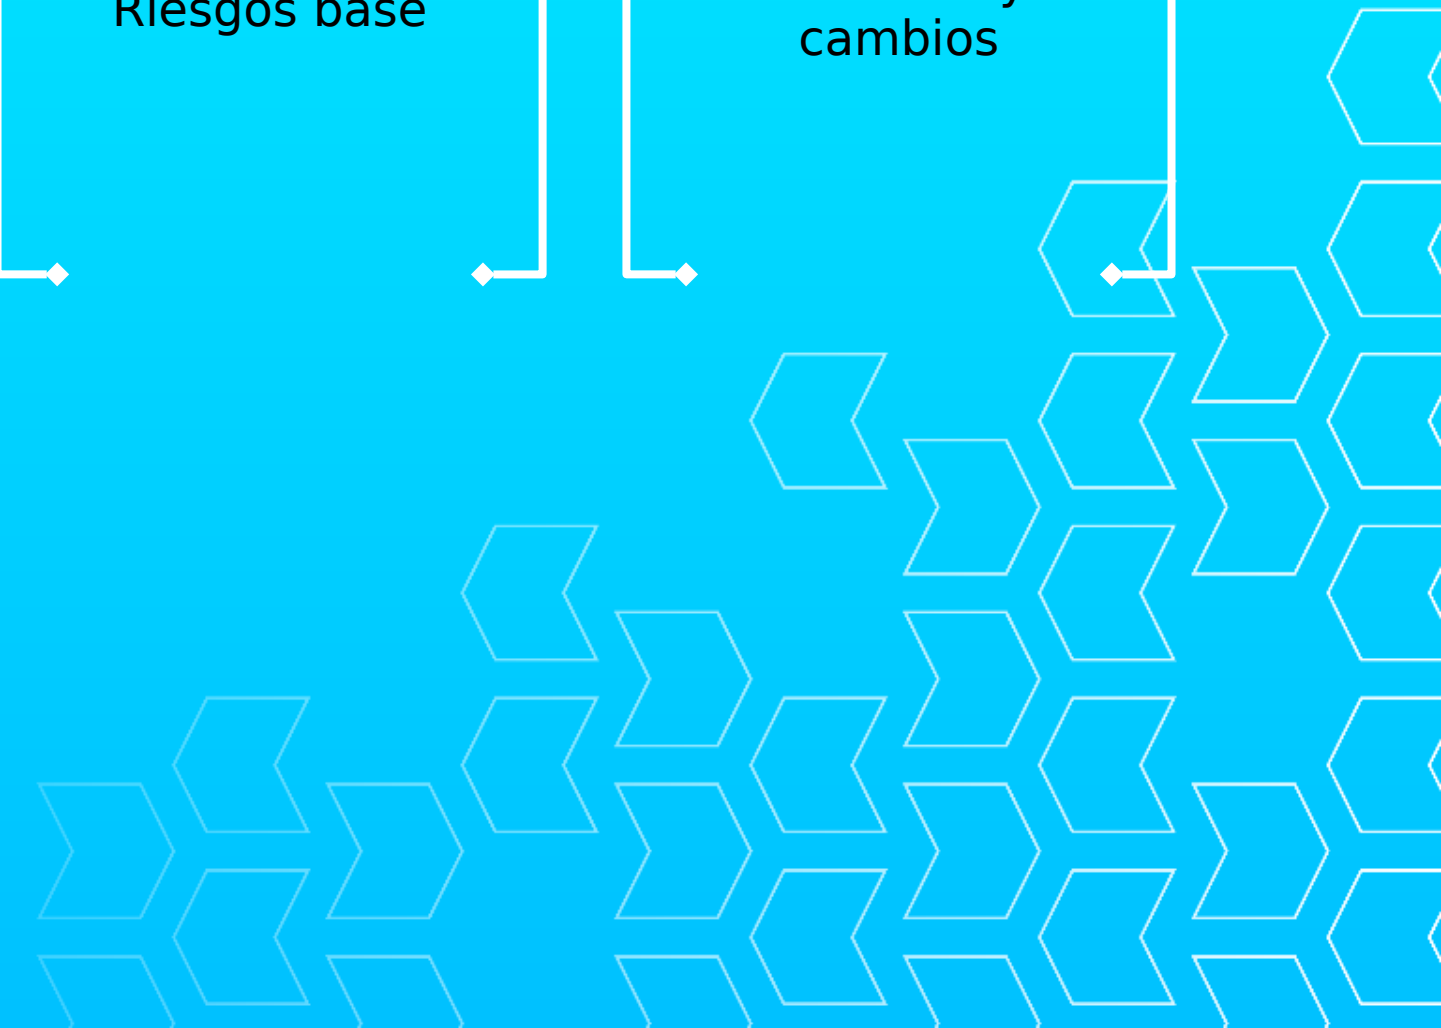

EL ENTREGABLE DE HOY • 3
min

Lo que te llevas al final de la clase

Tu Plan Base en cinco partes. Lo armamos por tramos, uno al cerrar cada bloque.

1

BACKLOG

Tus épicas,
historias y tareas,
en tres niveles y
sin relleno.

2

WBS

Tus entregables
descompuestos en
paquetes, con un
responsable cada
uno.

3

CRONOGRAMA

Tus fases, tus hitos
y quién decide en
cada uno.

4

RIESGOS

Tres riesgos
escritos como «si...
entonces»,
puntuados y con
dueño.

5

MEDICIÓN

Tus KPIs con meta y
frecuencia, y tu
regla de control de
cambios.

No es tarea para después: se arma aquí, en clase, sobre tu proyecto real.

**TU PROYECTO · 5
min**

¿Qué tan lejos llega tu plan hoy?


- 1 Tengo una idea de lo que hay que hacer.
- 2 Tengo una lista de tareas escrita.
- 3 Tengo la lista agrupada por entregables.
- 4 Tengo fechas comprometidas por entregable.
- 5 Tengo fechas, riesgos con dueño y cómo voy a medir.

Escriban en el chat solo el número. Sin trampa: el más alto que puedan sustentar hoy.

Cómo lo hacemos: Al final de la clase repetimos la pregunta. La idea es que el número suba.



01.




Backlog y entregables



El Backlog: Organización del Valor

El backlog es una lista dinámica, estructurada y priorizada de todo el trabajo necesario para completar el proyecto. Es la **única fuente de la verdad**. Se organiza de mayor a menor complejidad mediante un desglose progresivo:

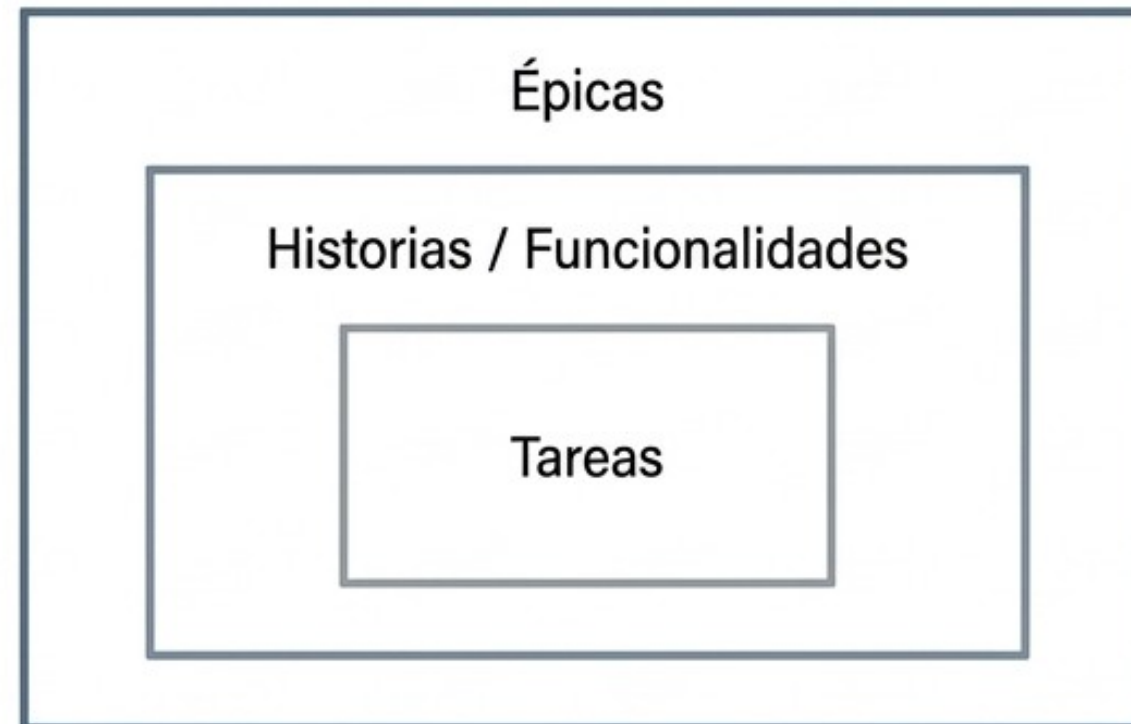

1. **Épicas:** Grandes iniciativas o módulos del proyecto.
2. **Historias / Funcionalidades:** Entregables específicos desde la perspectiva del usuario.
3. **Tareas:** Acciones concretas que el equipo debe ejecutar.



CASO 1 · 7
min

El recordatorio de citas, en tres niveles

Seis clínicas dentales. Ya está decidido el recordatorio por WhatsApp; ahora hay que planificarlo.

1 Reducir la inasistencia a citas de 22 % a 12 %.

2 Como paciente, quiero confirmar mi cita con un clic.

3 Redactar el texto del mensaje de recordatorio.

4 Dejar operativo el envío automático en las seis sedes.

5 Como recepcionista, quiero ver las citas sin confirmar.


6 Contratar el plan de mensajería con el proveedor.

Escriban en el chat solo los números que sean ÉPICAS.

Cómo lo hacemos: Cuento hasta cinco, leo el chat y dos voces al micro sustentan el que nos divida.

Priorización de Entregables

No todo el trabajo tiene la misma importancia. El backlog se prioriza para asegurar que el equipo trabaje siempre en lo más importante primero, maximizando el retorno de inversión temprano.

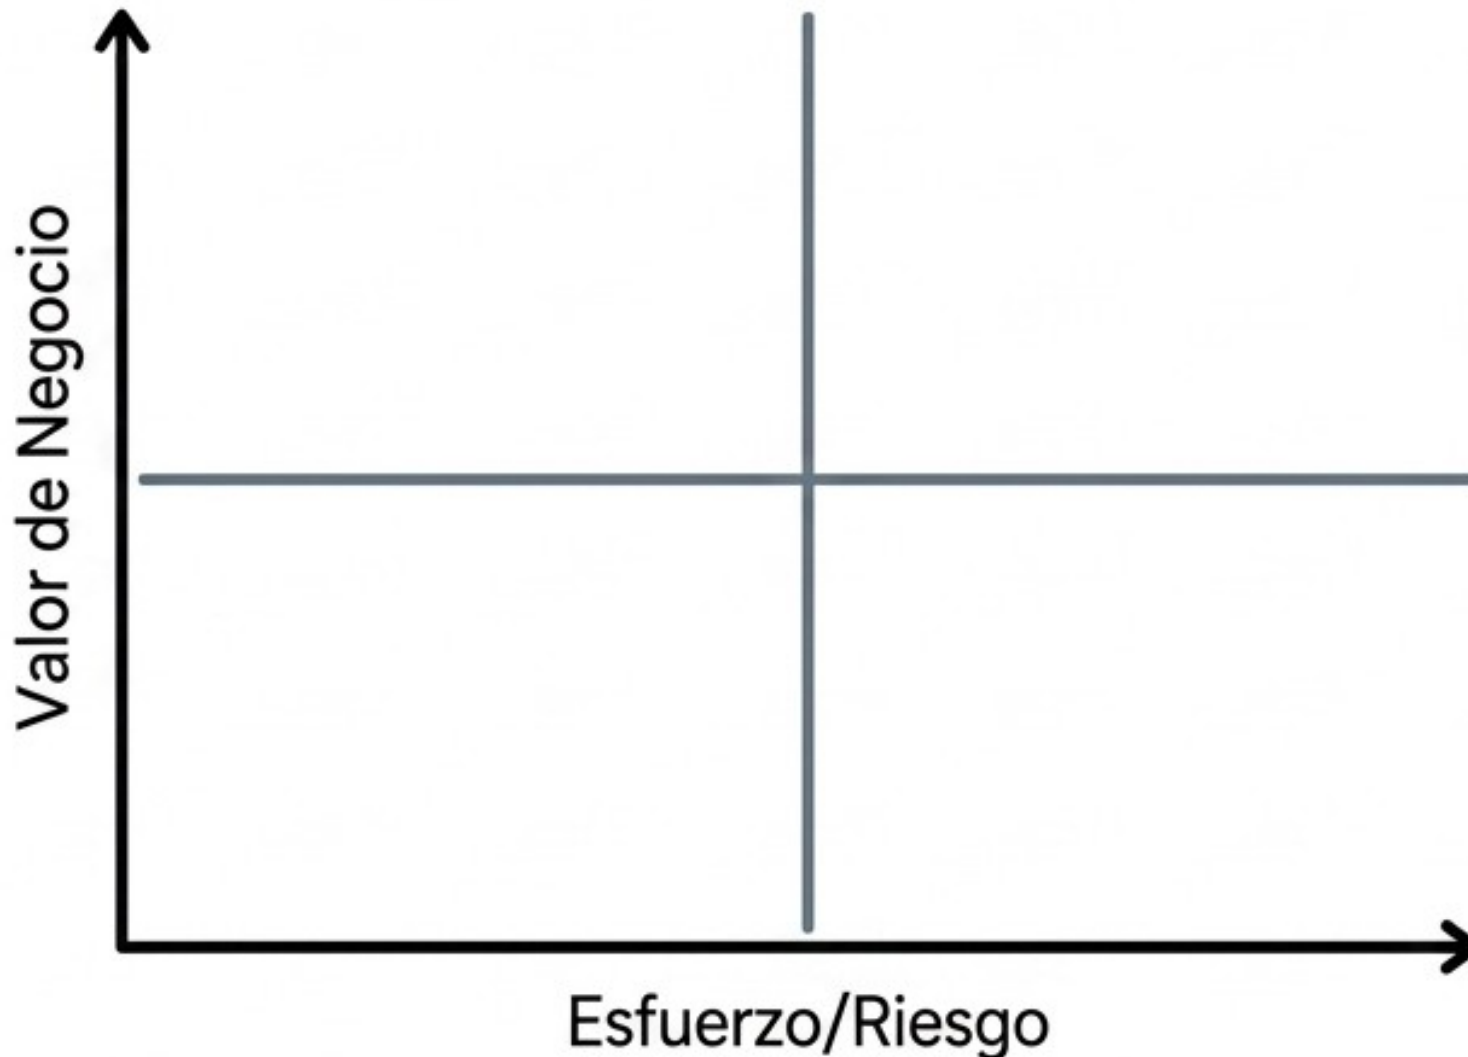

Criterios clave:

- Valor de negocio: ¿Qué genera mayor impacto o ingreso?
- Riesgo: ¿Qué componentes críticos deben validarse primero para evitar fallos tardíos?
- Dependencias: ¿Qué actividades bloquean el inicio de otras?

Conexión con los Resultados Esperados



El backlog no es solo una lista de tareas aisladas; es el mapa **estructurado hacia** el producto final. Cada ítem del backlog debe estar directamente alineado con los objetivos estratégicos y resultados esperados del proyecto.

Regla de oro: Si una tarea no contribuye al entregable final ni genera valor comprobable, debe ser cuestionada o eliminada.

TU PLAN · PARTE 1 DE 5 · 8 min

BACKLOG

WBS

CRONOGRAMA

RIESGOS

MEDICIÓN

Tu backlog en tres niveles

Épica

Historia o entregable


Tarea

La regla de oro de esta sesión: si una tarea no contribuye a un entregable, cuestionala o bórrala.



Cómo lo hacemos: Escriban en el chat una tarea que iban a hacer y que, mirándola así, ya no aporta a nada.

02.




WBS ligera



Estructura de Desglose del Trabajo (WBS)

Descomposición del Alcance

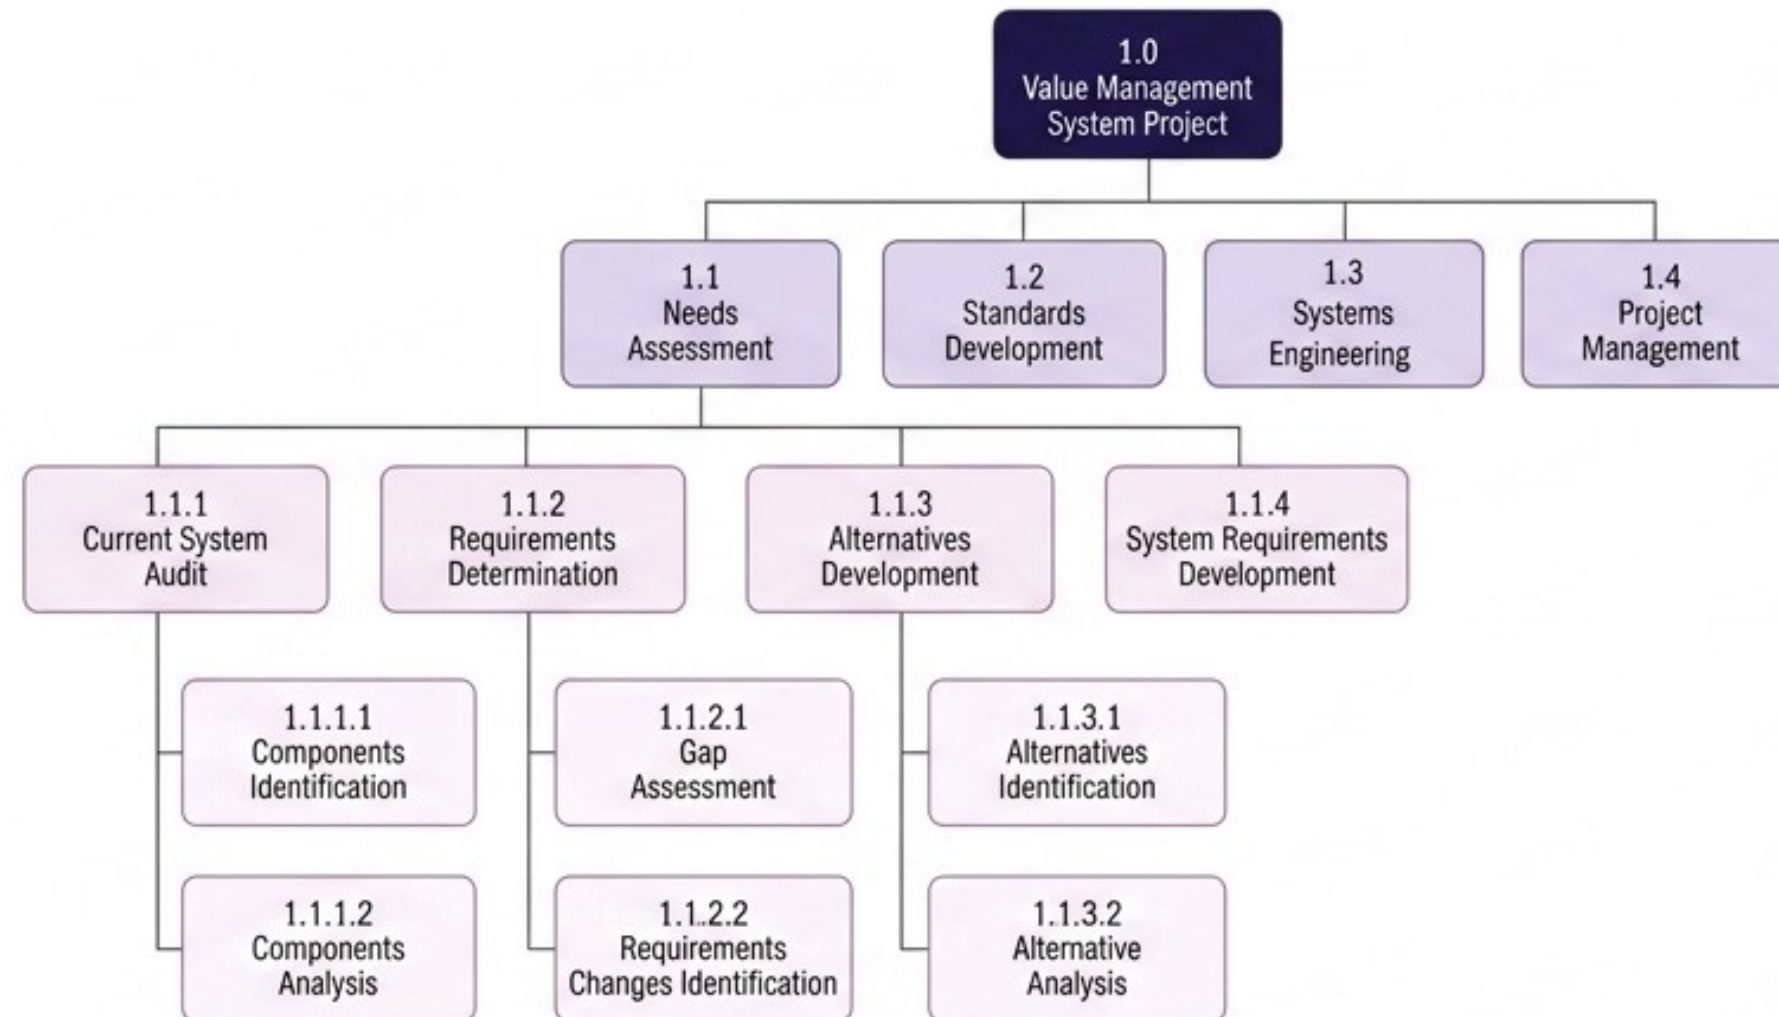

La WBS es una representación jerárquica que divide el alcance total del proyecto en partes más pequeñas y manejables.

A diferencia del backlog (que es una lista plana), la WBS ofrece una visión global estructurada. Sigue la Regla del 100%: la suma del trabajo en los niveles inferiores debe equivaler exactamente al 100% del trabajo en los niveles superiores, asegurando que no falte ni sobre nada.

PRÁCTICA • 7
min

La regla del 100 %

WBS del recordatorio. Estos son los paquetes que hoy cuelgan de «1.2 Puesta en marcha».

1.2.1

Configurar el envío
automático en la
plataforma

1.2.2

Redactar y aprobar los
tres formatos de
mensaje

1.2.3

Probar el envío con
una sede piloto

1.2.4

¿?

¿Qué falta para que la suma de los paquetes sea el 100 % de «Puesta en marcha»? Escribanlo en el chat.

Cómo lo hacemos: Tres minutos. Leo cuatro respuestas y armamos el nivel completo en pantalla.

Paquetes de Trabajo y Entregables

El nivel más bajo y detallado de la WBS se denomina Paquete de Trabajo.



Son componentes definidos donde se pueden estimar costos y duraciones con precisión.

Representan entregables principales terminados, no las acciones para hacerlos (definen el "qué", no el "cómo").

Permiten controlar de manera eficiente partes específicas del proyecto sin perderse en la micro-gestión.

Utilidad y Asignación de Responsables



Organización del Equipo:

Todo el equipo entiende el panorama completo y cómo su trabajo encaja. Facilita estimaciones precisas y reduce la ambigüedad definiendo qué está incluido y excluido.

Apropiación (Accountability):

La WBS ligera asigna un único responsable a cada paquete de trabajo. Esto evita la confusión sobre la propiedad de los entregables, definiendo claramente quién ejecuta el trabajo y quién debe aprobarlo.

Tu WBS en dos niveles

Entregable (nivel 1)

Paquetes de trabajo (nivel 2)


Responsable

«Ligera» son dos o tres niveles, no veinte. Si un paquete no lo puedes estimar en horas, todavía es un entregable.

Cómo lo hacemos: Escriban en el chat el nombre de uno de sus paquetes. Les digo si es un «qué» o un «cómo».



03.



Cronograma macro



Cronograma Macro: Hitos y Fases

El cronograma macro proporciona la estructura temporal del proyecto.



Fases:

Etapas lógicas y secuenciales de ejecución donde se agrupa el trabajo (Ej. Diseño, Construcción, Pruebas).

Hitos (Milestones):

Puntos de control críticos o eventos de duración cero. Marcan logros importantes, entregas clave o fechas límite inamovibles. No son tareas; son momentos de evaluación.

VOTACIÓN RÁPIDA · 5
min

¿Hito o tarea?

Escriban H o T en el chat en cada uno. Van seis, uno por vez.

1 Diseño de los mensajes aprobado por la clínica.

2 Redactar los tres formatos de mensaje.

3 Piloto en una sede terminado y evaluado.

4 Configurar la plantilla en la plataforma.


5 Contrato firmado con el proveedor de mensajería.

6 Capacitar a las doce recepcionistas.

El hito no tiene duración: es el momento en que alguien decide si seguimos. Si ahí nadie decide nada, es una fecha decorativa.

Secuencia y Gestión de Dependencias


Definir actividades implica establecer un orden lógico. No todo puede ser paralelo. Las dependencias determinan qué actividades bloquean a otras:



- **Relación Fin a Inicio:** La más común. "No podemos probar el sistema hasta terminar de programarlo".



- **Dependencias Internas:** Controladas por el propio equipo del proyecto.



- **Dependencias Externas:** Sujetas a terceros, como proveedores, aprobaciones legales o el clima.



Estimación de Duración

Determinar cuántos períodos de trabajo (días, semanas) se necesitan para completar una actividad.

- **Esfuerzo vs. Duración:** 40 horas de esfuerzo pueden tomar 2 semanas de duración en el calendario si el recurso solo trabaja medio tiempo.
- Incluye los márgenes de seguridad para imprevistos.
- Permite proyectar rutas críticas y negociar fechas límite realistas frente a las expectativas del cliente o negocio.



PRÁCTICA · 8
min

¿Qué bloquea a qué?

Cinco actividades del proyecto, con su duración y lo que necesitan antes.

A

Contratar el
proveedor de
mensajería

2 semanas

no necesita nada

B

Aprobar los textos
con la clínica

1 semana

no necesita nada

C

Configurar el
envío automático

1 semana

necesita A y B

D

Piloto en una sede

2 semanas

necesita C

E

Despliegue a las
cinco sedes

3 semanas

necesita D

Escriban en el chat la cadena más larga y cuántas semanas dura en total. Esa es su ruta crítica.

Cómo lo hacemos: Cuatro minutos. Después la dibujamos en pantalla y vemos qué actividad tiene holgura.

Tu cronograma macro

Fase	Hito que la cierra	¿Quién decide ahí?	Semana

Si tus tres hitos caen todos en las últimas dos semanas, no tienes cronograma: tienes una fecha de entrega.

Cómo lo hacemos: Escriban en el chat su primer hito y en qué semana cae. Si cae después de la semana seis, conversamos.



PARADA DE DUDAS · 5
min

Parada de dudas


Acumulamos y resolvemos en bloque, para no cortar el hilo cada vez.

«En mi proyecto, _____. Mi duda es _____.»

- 1 Una duda por persona y en una sola línea del chat.
- 2 Duda sobre tu proyecto, no pregunta de examen: «¿esto entra en la prueba?» no cuenta.
- 3 Si tu duda ya está en el chat, responde «+1» en lugar de repetirla. Así veo cuántos la comparten.

Cómo lo hacemos: Las que no alcance quedan en el chat: las respondo en el aula virtual antes de la próxima clase.

04.



Riesgos base



Gestión de Riesgos: Identificación Inicial

Un riesgo es un evento incierto que, de ocurrir, tiene un efecto positivo (oportunidad) o negativo (amenaza) en los objetivos del proyecto.



La identificación inicial requiere separar los riesgos reales, documentables y medibles, de las simples "preocupaciones" cotidianas. Permite al equipo prepararse de manera proactiva frente a la incertidumbre en lugar de actuar en modo "apagar incendios".

CASO 2 · 7
min

¿Riesgo o preocupación?

Un riesgo se puede describir, puntuar y asignar. Una preocupación solo se puede repetir.

1 Me preocupa que el proyecto no salga bien.

2 El proveedor tiene 15 días de plazo y nosotros planificamos 7.

3 La clínica podría no aprobar los textos a tiempo.

4 El equipo está estresado.

5 Si el número del paciente está mal registrado, el mensaje no llega.

6 Ojalá el cliente no cambie de opinión a mitad de camino.

Escriban en el chat los números que sean RIESGOS. Después punteen el número 2: probabilidad de 1 a 5 por impacto de 1 a 5.

El cruce determina el Nivel de Prioridad. Los de 'Alta Prioridad' exigen planes inmediatos; los de 'Baja Prioridad' pasan a una **lista de vigilancia preventiva.**

Estrategias de Respuesta y Responsables

Todo riesgo crítico debe tener una estrategia definida y un "**Dueño del Riesgo**" claramente asignado:

	1. Evitar: Cambiar el plan original para eliminar la amenaza por completo.
	2. Mitigar: Tomar acciones tempranas para reducir la probabilidad o el impacto.
	3. Transferir: Pasar la responsabilidad y el impacto financiero a un tercero (ej. contratar un seguro).
	4. Aceptar: Reconocer el riesgo sin tomar acción preventiva, reservando tiempo/dinero por si ocurre.



Tus tres riesgos, con dueño

Si ____, entonces ____

P × I

Estrategia


Dueño (un nombre)

Un riesgo sin dueño con nombre propio no está gestionado: está anotado.

Cómo lo hacemos: Escriban en el chat su riesgo de mayor puntaje y quién es el dueño. Si el dueño eres tú en los tres, revísalo.



05.



Plan de medición y
control de cambios



Plan de Medición: KPIs y Metas

Lo que no se mide, no se puede gestionar ni mejorar. Los **indicadores** permiten evaluar si el proyecto avanza realmente hacia sus objetivos estratégicos.

- **KPIs (Indicadores Clave de Desempeño):** Métricas tangibles alineadas con la entrega de valor, no métricas de vanidad.
- **Metas SMART:** Para ser útiles, los objetivos deben ser Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y con un Tiempo definido.



VOTACIÓN RÁPIDA · 5
min

¿KPI o métrica de vanidad?

Métricas del proyecto de recordatorios. Escriban K o V en el chat, una por vez.

1 Cantidad de mensajes de recordatorio enviados.

3 Número de reuniones de coordinación del equipo.

5 Cantidad de plantillas configuradas en la plataforma.

2 Porcentaje de citas confirmadas por el paciente.

4 Porcentaje de inasistencia semanal por sede.

6 Ingreso recuperado por sillas que sí se ocuparon.

La prueba: ¿qué decisión tomarías distinto si ese número fuera la mitad? Si la respuesta es «ninguna», es vanidad.

Evidencia de Avance: Datos vs. Sentimientos

El progreso del proyecto no se evalúa con sensaciones u opiniones; exige evidencia dura.



El plan de medición debe recopilar sistemáticamente datos de desempeño del trabajo:

- Porcentaje real y verificable de trabajo completado.
- Entregables formalmente validados y aceptados por el cliente.
- Desviaciones registradas matemáticamente respecto a la línea base original (presupuesto y tiempo).




Cadencia de Revisión y Responsabilidad

Frecuencia Estructurada: Un plan exige ritmo constante para detectar desviaciones a tiempo.



Diario: Sincronizaciones rápidas para detectar bloqueos operativos.



Semanal: Medición de velocidad y progreso de entregables.



Fin de Fase: Revisiones profundas de hitos críticos y calidad.

Dueños del Seguimiento: Debe definirse quién recopila los datos, quién analiza la varianza (planeado vs. real) y quién reporta a los interesados para garantizar transparencia total.



Control de Cambios: La Solicitud Formal


Los proyectos siempre cambian, pero no deben mutar en caos ni descontrol ("Scope Creep"). El control de cambios es el mecanismo para evaluar alteraciones de manera disciplinada.

Todo inicia con una Solicitud de Cambio Formal. Esta documenta qué se requiere modificar (nuevas funcionalidades, ajuste de fechas, problemas detectados) en lugar de implementarlo impulsivamente sin un análisis previo.

Análisis de Impacto

Toda solicitud se evalúa de manera holística. Un cambio en una esquina del triángulo inevitablemente deforma las otras:

- **Alcance:** ¿El cambio añade, modifica o quita entregables?
- **Cronograma (Tiempo):** ¿Retrasa la fecha final de entrega o impacta la ruta crítica?

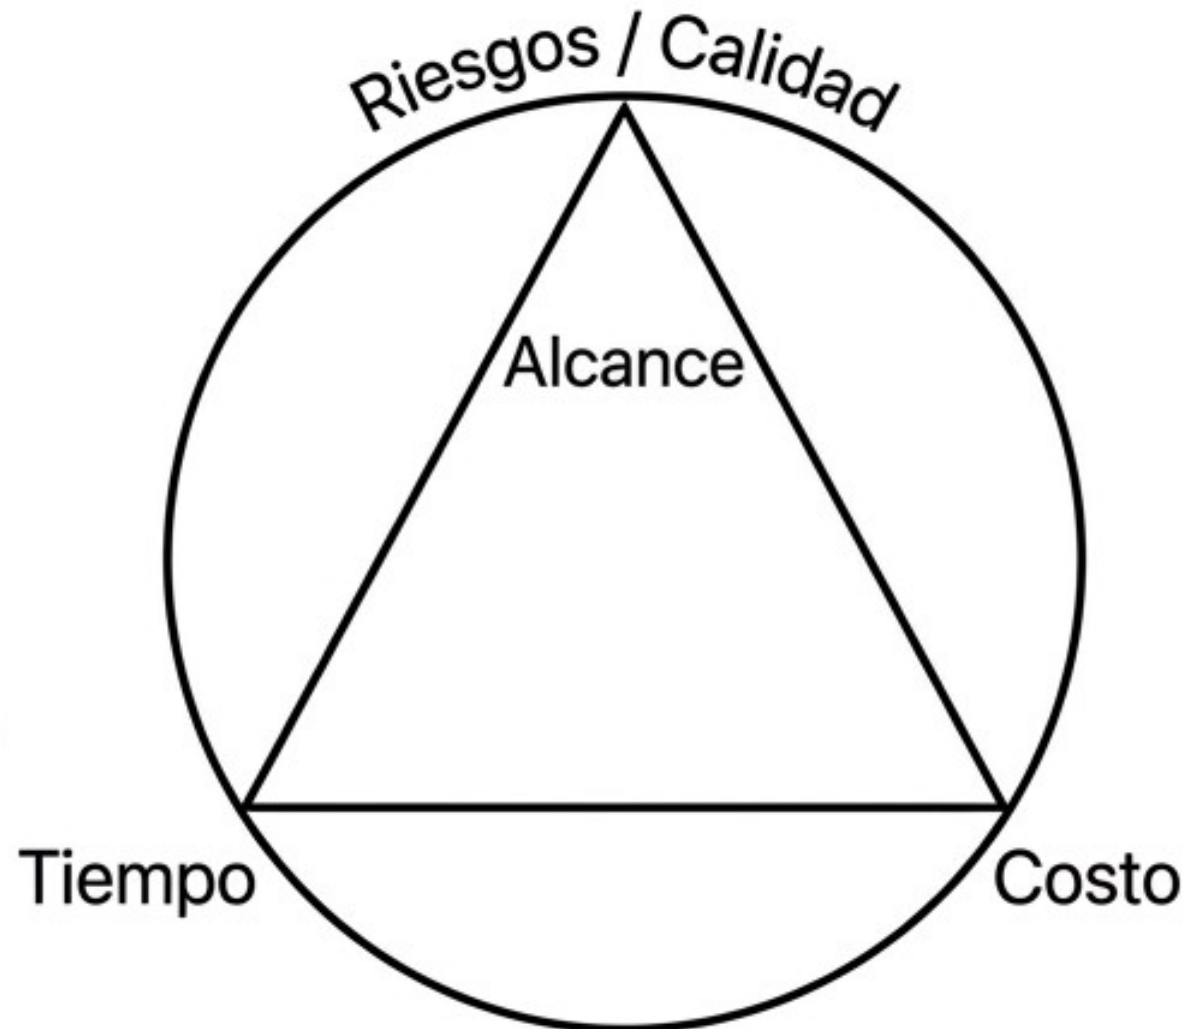

- **Costo / Recursos:** ¿Requiere inyectar más presupuesto o aumentar horas extra?
- **Riesgos:** ¿Esta alteración introduce nuevas amenazas técnicas o de negocio?

CASO 3 · 8
min

«¿Y si también les mandamos la boleta?»

Semana 6 de 8. El proyecto va en fecha y la clínica pide sumar el envío de la boleta electrónica.

Costo del cambio

+ S/ 4 500 por la integración
con facturación

Tiempo del cambio

+ 2 semanas sobre la ruta
crítica

Lo que queda


S/ 3 000 de presupuesto y una
fecha intocable de marzo

Escriban en el chat su recomendación: A aprobar · B rechazar · C aprobar, pero fuera de este proyecto.

Cómo lo hacemos: Cuento hasta cinco. Después dos voces sustentan y vemos qué línea base habría que mover en cada caso.

Decisión, Registro y Comunicación

1. Aprobación Oficial: La autoridad designada (Comité, Sponsor o Product Owner) aprueba, rechaza o difiere la solicitud basándose en el análisis de impacto.

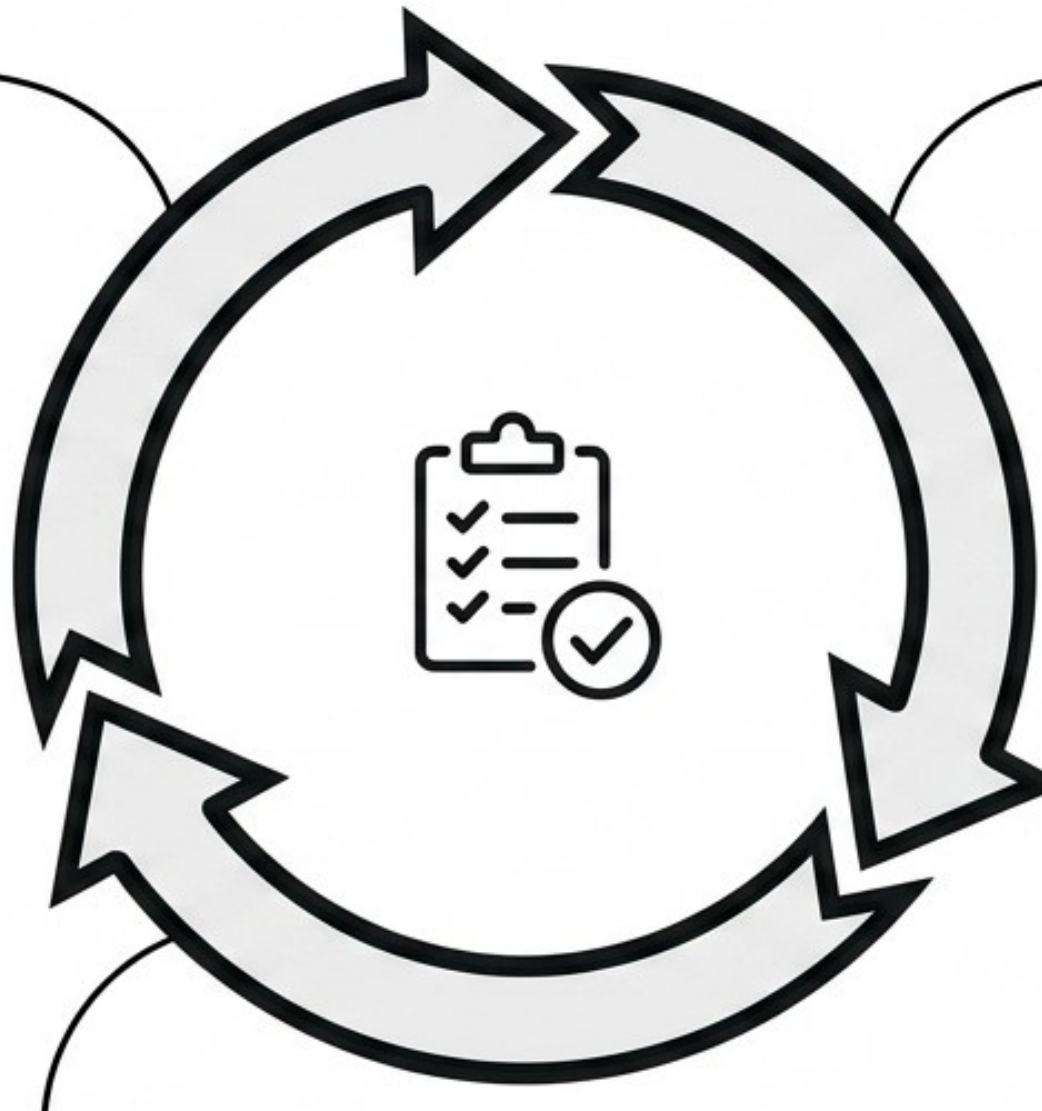

2. Registro Histórico: La decisión se documenta ineludiblemente en el Log de Cambios para mantener trazabilidad.

3. Reflejo en el Plan: Si es aprobado, las líneas base (cronograma, WBS, presupuesto) se reajustan. Se debe comunicar de inmediato al equipo cómo esto impacta su trabajo diario.

Cómo mides y cómo cambias

KPI

Meta

Cada cuánto lo mido


Un cambio en mi proyecto lo autoriza _____, y queda registrado en _____.

Si nadie tiene autoridad para decir «no» a un cambio, tu alcance no tiene frontera.

Cómo lo hacemos: Escriban en el chat quién autoriza los cambios en su proyecto. Un nombre, no un área.



06.



Herramientas



Herramientas: WBS en Excel o MS Project




WBS	Nombre de la Tarea	Duración	Responsable
1	▼ Fase 1: Planificación		
1.1	▼ Sub-entregable A: Requisitos		
1.1.1	Paquete de Trabajo: Talleres con Usuarios		Juan Pérez
1.1.2	Paquete de Trabajo: Documentación Inicial		Ana Gómez
			Carlos Rodríguez
2	▼ Fase 2: Diseño		
2.1	▼ Sub-entregable A: Requisitos		
2.1.1	Paquete de Trabajo: Talleres con Usuarios		Juan Pérez
2.1.2	Paquete de Trabajo: Documentación Inicial		Ana Gómez
2.2	▼ Sub-entregable A: Diseño		Ana Gómez
2.2.1	Paquete de Trabajo: Organización		Ana Gómez
2.2.2	Paquete de Trabajo: Documentación		Ana Gómez
2.2.3	Paquete de Trabajo: Documentación		Ana Gómez

La teoría académica se traduce en herramientas de uso diario.

- **Organización Indentada:** Las listas con sangría (indentación) estructuran de forma evidente las Fases superiores, sub-entregables y paquetes de trabajo base.
- **Propiedad Visual:** Añadir una columna de "Responsable" convierte la hoja de cálculo en una herramienta de rendición de cuentas (Accountability). Cualquiera consulta el documento y sabe exactamente quién es el dueño de cada bloque.

Herramientas: Cronograma Tipo Gantt

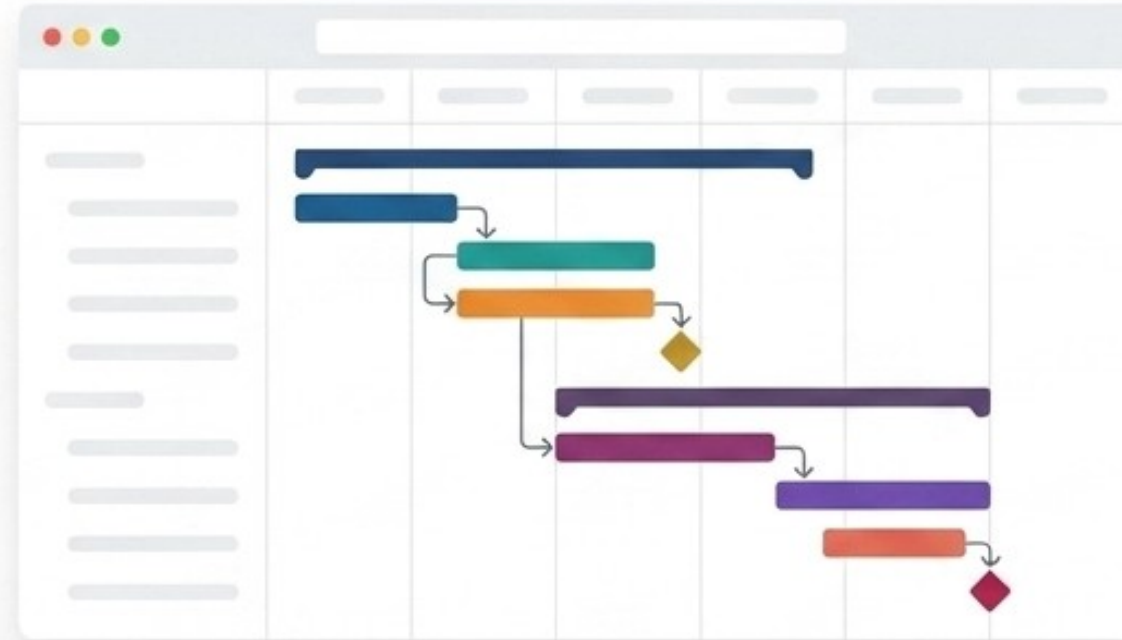

El Diagrama de Gantt es la traducción visual del cronograma macro.

- **Enlaza** directamente la WBS con el calendario, mostrando duraciones como barras horizontales.
- **Dependencias:** Las flechas lógicas conectan las actividades, revelando visualmente qué tarea bloquea el inicio de la siguiente.
- **Hitos:** Representados comúnmente como rombos, marcan fechas inamovibles o entregas de alto valor, dictando el ritmo crítico del proyecto.

Herramientas: Matriz de Riesgos

ID	Descripción	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Puntuación (Nivel de Riesgo)	Estrategia de Respuesta	Acción Preventiva	Responsable (Dueño)
R01	Retraso en entrega de proveedor	Proveedor saturado	Desfase en cronograma	4	5	20	Mitigar	Buscar proveedor alternativo	Juan Pérez
R02	Fallo en sistema critico	Error de software	Interrupción del servicio	2	4	8	Evitar	Actualizar software	María González
R03	Aumento de costes de material	Inflación	Impacto presupuestario	3	3	9	Transferir	Contrato con precio fijo	Carlos Rodríguez
R04	Baja del líder del proyecto	Salud	Pérdida de conocimiento	1	4	4	Aceptar	Documentación exhaustiva	Ana Gómez


El Registro Central organiza la incertidumbre. En Excel, una matriz de riesgos eficaz debe incluir columnas ejecutables:

- ID, Descripción, Causa y Consecuencia del riesgo.
- Puntuación de Probabilidad x Impacto (Nivel de riesgo con formato condicional).
- Estrategia de Respuesta (Mitigar, Evitar, etc.) y Acción Preventiva.
- Responsable (Dueño): Quién vigila que la estrategia se cumpla.

Herramientas: Tablero de Seguimiento (Kanban)

Para controlar la ejecución diaria sin burocracia, un **tablero visual** es indispensable.

- **Mapea** el progreso de los entregables en columnas lógicas: Pendiente, En Proceso, Validado/Hecho.
- **Visibilidad de Bloqueos:** Si muchas tarjetas se estancan en "En Proceso" o tienen etiquetas rojas, el equipo visualiza un cuello de botella inmediato.
- Incluye **avatares de los responsables** para asegurar total transparencia.

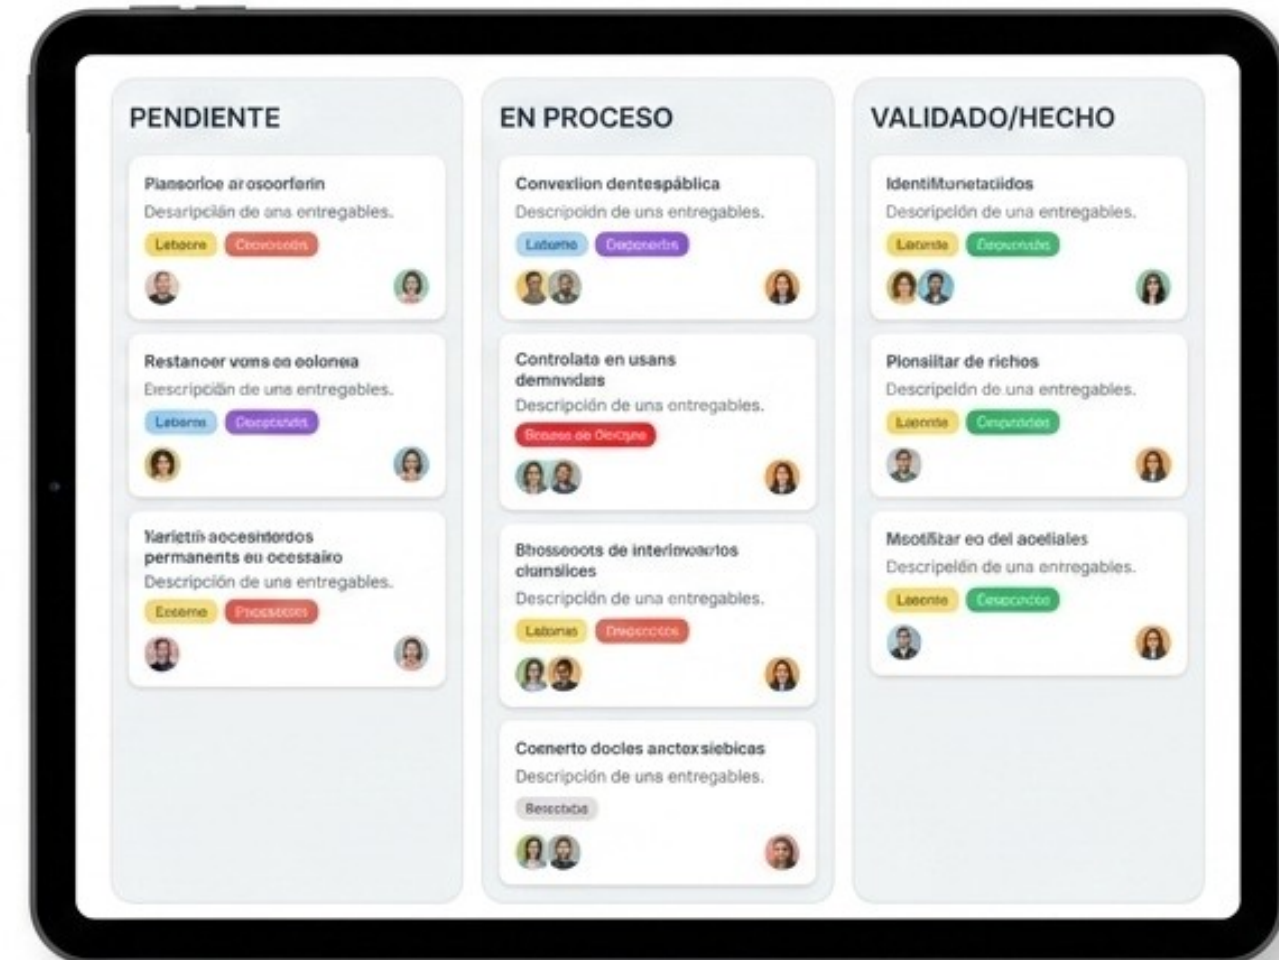

Herramientas: El Log de Cambios

A	B	C	D	E	F	G
Registro de Solicitudes de Cambio						
ID	Fecha Solicitud	Descripción del Cambio	Motivo	Impacto Estimado (Costo/Tiempo)	Decisión (Estado)	Responsable
C001	2024-01-15	Adición de módulo de reportes	Requerimiento del cliente	+\$5000 / +2 semanas	Aprobado	Juan Pérez
C002	2024-02-01	Cambio de proveedor de base de datos	Mejora de rendimiento	Neutro / +1 semana	Pendiente	María Gómez
C003	2024-02-10	Reducción de alcance en fase 2	Ajuste presupuestario	-\$3000 / -1 semana	Rechazado	Carlos Rodríguez
C004	2024-02-20	Integración con API externa	Nueva funcionalidad estratégica	+\$2000 / +1.5 semanas	Implementado	Ana López



El **Registro Histórico** que protege el entorno del proyecto. El "Change Log" documenta oficialmente cómo evoluciona el alcance, justificando por qué variaron las fechas o presupuestos iniciales.

Columnas clave:

- ID y Fecha de la Solicitud.
- Motivo del Cambio e Impacto Evaluado.
- Decisión Final (Aprobado/Rechazado) y Responsable.
- Estado de Implementación.

Caso de Estudio: Emprendimiento Tecnológico

Lanzamiento de una App (Startup)



Un equipo universitario lanza una nueva App. Aplicando planificación ligera antes de programar una sola línea de código:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Alcance: Crean un Backlog priorizando estrictamente el Producto Mínimo Viable (MVP). | <ul style="list-style-type: none"> • Cronograma: Dividen el macro en sprints iterativos de 2 semanas. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Riesgos: Identifican la “caída del servidor” como riesgo del servidor” como riesgo alto y asignan a un programador para mitigarlo preventivamente. | <ul style="list-style-type: none"> • Cambios: Usan un Kanban digital, adaptando los requisitos rápidamente pero dejando rastro en su bitácora. |

Caso de Estudio: Empresa de Servicios

Campaña de Marketing Integral



Una agencia ejecuta una campaña masiva para un cliente exigente:

- **WBS:** Dividen el alcance en Producción Audiovisual, Medios Digitales y Eventos, asignando un responsable por rama.

- **Gantt:** Mapean dependencias críticas (Ej. "No imprimir espectaculares hasta que el cliente firme el diseño final").

- **Medición:** KPIs diarios sobre gasto publicitario vs conversiones.

- **Cambios:** Si el cliente pide añadir un Influencer a mitad de campaña, evalúan costo extra y retraso antes de decir "sí".

MICRÓFONO ABIERTO • 10
min

Presenta tu Plan Base en 90 segundos

Un voluntario recorre sus cinco partes. El resto busca los huecos por el chat.

1

El entregable que le falta

Algo que su alcance sí cubre y su WBS no.

2

El riesgo que no vio

Escríbelo en formato «si ____, entonces ____».

3

El hito que llega tarde

El primer punto donde alguien decide algo.


Regla: para objetar hay que proponer. Si dices que le falta un entregable, escribe cuál.

Cómo lo hacemos: Tres rondas de tres minutos. Consigo los voluntarios por chat mientras avanzamos la lámina anterior.



¿Cumplimos el objetivo?

Al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de **construir el Plan Base del proyecto listo para iterar**, definiendo y organizando **backlog/entregables**, una **WBS ligera**, **cronograma macro**, **riesgos base**, **plan de medición** y **mecanismo de control de cambios**, utilizando **WBS (Excel/MS Project)**, **cronograma (Gantt/Project)**, **matriz de riesgos**, **tablero de seguimiento** y **log de cambios**.

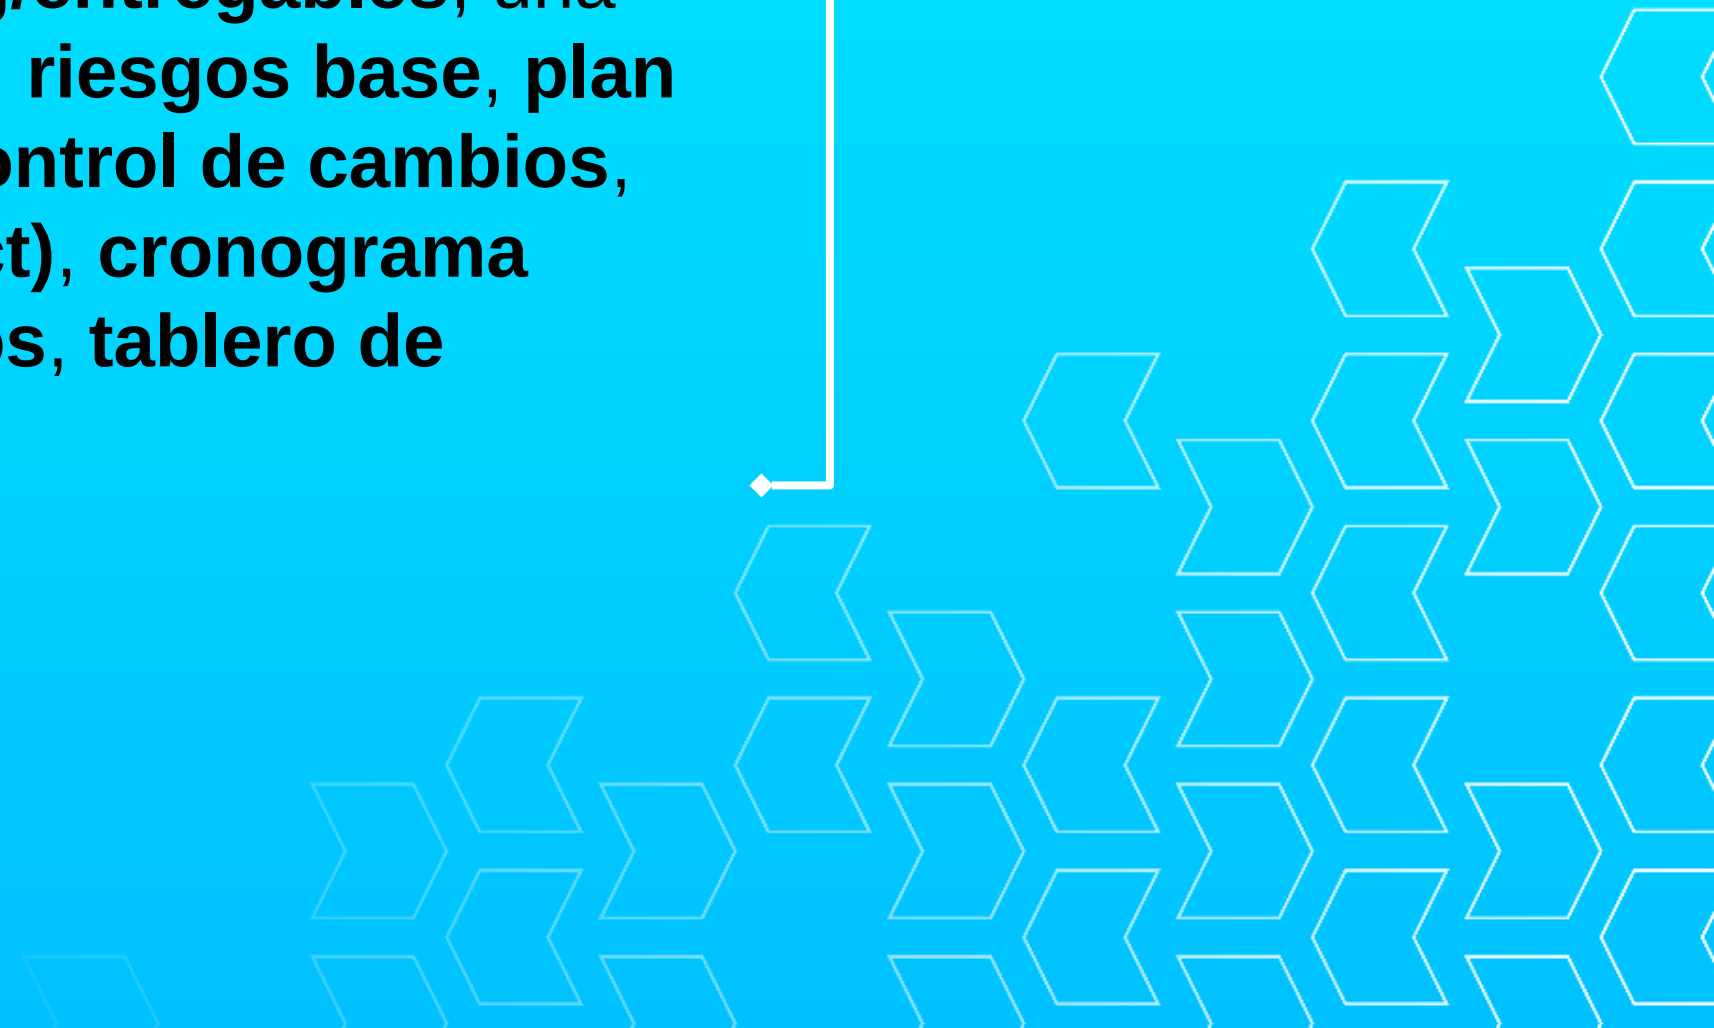



Conclusiones:



Planificar antes de ejecutar no frena la agilidad; es el motor que la habilita.

Una planificación ligera:

- **Ordena** el trabajo mediante Backlogs orientados a valor y una WBS estructurada.
- Reduce sorpresas anticipando Riesgos y definiendo un Cronograma realista.
- Mide el éxito basándose en evidencia y datos duros, no en sentimientos.
- **Gestiona cambios** protegiendo los recursos sin perder capacidad de adaptación.

El verdadero éxito radica en el equilibrio entre preparación rigurosa y ejecución flexible.

CIERRE • 4 min

Ticket de salida

Cinco líneas en el formulario del aula virtual, antes de que cerremos la sesión.

1 Mi entregable principal es _____ y se compone de ____ paquetes.

2 Mi primer hito es _____, en la semana ____, y lo aprueba _____.

3 Mi riesgo mayor: si _____, entonces _____. Dueño: _____.

4 Mi KPI principal es _____ y lo mido cada _____.

5 Del 1 al 5, mi plan hoy está en el nivel _____.

Cómo lo hacemos: La línea 5 es la misma pregunta del inicio de la clase. Comparamos en voz alta antes de cerrar.

Bibliografía:

- Ambler, S. W., & Lines, M. (2023). ¡Elija su WoW! Un enfoque de Disciplined Agile para optimizar su forma de trabajar (2.^a ed.). Project Management Institute, Inc.
- Project Management Institute. (2025). The standard for project management and a guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) (8th ed.)



Thank you!

**“There is nothing impossible to
they who will try.”
— Alexander the Great**



UTEC

UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA
Y TECNOLOGÍA

